



महाराष्ट्र शासन

१०० दिवस कृती आराखडा ध्येयपूर्ती

ऊर्जा विभाग
महाराष्ट्र शासन




महावितरण
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा यादी शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
१	नवीन उपकेंद्रे उभारणे - ३६	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर ४२ नवीन उपकेंद्रे उभारण्यात आली आहेत. उभारण्यात आलेल्या नवीन उपकेंद्रांचे फोटो व यादी सोबत जोडीली आहे.	-
२	उपकेंद्र क्षमतावाढ करणे - ११६	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर १७५ उपकेंद्राची क्षमतावाढ करण्यात आली आहे. यादी फोटो व यादी सोबत जोडीली आहेत.	-
३	वाहिनी पृथक्करण - ३०३ नग	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर ४५० वाहिन्यांचे पृथक्करण करण्यात आले आहे.	-
४	वाहिनी विभाजन - ५२५ किमी	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर १,१०१ किमी, वाहिनीचे विभाजन करण्यात आले आहे. त्याबाबतचे फोटो व यादी सोबत जोडीली आहे.	-
५	वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात केबल (ABC Cable) टाकणे - ३,४५० किमी	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर ६,१८० किमी, AB केबलची कामे वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात करण्यात आली आहेत. त्याबाबतचे फोटो सोबत जोडीले आहेत.	-
६	नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलणे (निरंतर वीज योजना) - ५,०००	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर ५,२४२ नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलण्यात (निरंतर वीज योजना) आली आहेत.	-
७	वाहिनी मीटरिंग - २,५१२	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर २,५८२ वाहिनी मीटर बसवण्यात आले आहेत.	-
८	ग्राहक मीटरिंग - ५,०३,२४८	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर १५,८७,३८० ग्राहक मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे फोटो सोबत जोडीले आहेत.	-
९	वितरण रोहित्र मीटरिंग - ९४,६३८	पूर्ण	दि. २१.०४.२०२५ अखेर १,०५,५०५ नग वितरण रोहित्र मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे फोटो सोबत जोडीले आहेत.	-
१०	वीज पुरवठा तास (शहरी) - २३.५९ तास	पूर्ण	शहरी भागात २३.५९ तास वीज पुरवठा देण्यात येतो.	-

महावितरण



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
११	वीज पुरवठा तास (ग्रामीण) - २३.५५ तास	पूर्ण	ग्रामीण भागात २३.५५ तास वीज पुरवठा देण्यात येतो.	-
१२	निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण केलेल्या वीज बिलिंग संबंधित तक्रारी - १००%	पूर्ण	वीज बिलिंग संबंधित तक्रारींचे निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण करण्यात आले आहे.	-
१३	निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण केलेल्या वीज पुरवठा संबंधित तक्रारी - १००%	पूर्ण	वीज पुरवठा संबंधित तक्रारींचे निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण करण्यात आले आहे.	-
१४	निर्दिष्ट वेळेमध्ये देण्यात नवीन आलेल्या वीज जोडण्या - १००%	पूर्ण	१०० % नवीन वीज जोडण्या निर्दिष्ट वेळेमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत.	-
१५	प्रधानमंत्री - सूर्य घर मोफत वीज योजना - ५४,७६३ नग / २१७ मे.वॅ.	पूर्ण	१,०८,३१८ लाभार्थ्यांच्या छतावरील ४०५ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आले आहेत. फोटोसोबत जोडले आहेत.	-
१६	पी-एम कुसुम घटक -ब योजना - मागेल त्याला सौर पंप योजना - ७२,७०५	पूर्ण	मागेल त्याला सौर पंप योजना १,४८,९२९ सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले आहे.	-
१७	सौर ग्राम योजना (गावांचे १००% सौर ऊर्जाकरण) - ८ गावे	पूर्ण	कार्यक्रमांतर्गत १२ सौर ग्राम झाले असून फोटो व यादी सोबत जोडली आहे.	-
१८	मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० - ६९० मे.वॅ./१३९ उपकेंद्रे	पूर्ण	मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत १४८ उपकेंद्रांवरील ७२१ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहे. फोटो व यादी सोबत जोडली आहे.	-



महानिर्मिती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

महानिर्मिती



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
१	कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे २ x ६६० मेगावॅट चे सुपर क्रिटिकल औष्णिक विद्युत संचाची उभारणी.	पूर्ण	मे. भेल यांना दि. ०७.०२.२०२५ रोजी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. कार्यादेशांची प्रत सोबत जोडली आहे.	-
२	ग्रीन हायड्रोजन - भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे २० Nm ^३ /तास ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी ०.५ मेगावॅट क्षमतेचा ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प जानेवारी २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येईल.	पूर्ण	दि. १८ मार्च २०२५ रोजी १६:४९ वाजता सौरऊर्जा प्रकल्प आणि हायड्रोजन प्रकल्प समांतरपणे चालवले गेले आणि ग्रीन हायड्रोजन चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून त्याचे फोटो सोबत जोडले आहेत.	-



महापारेषण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

महापारेषण



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
१	किमान ३ महत्वाच्या ठिकाणी (सबस्टेशन) STATCOM च्या स्थापनेसाठी निवड करून तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे	पूर्ण	STU अहवालानुसार अ) ४०० के.व्ही. धुळे, ४०० के.व्ही. लोणीकंद व प्रस्तावित ७६५ के.व्ही. महापे या उपकेंद्रांची STATCOM प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४०० के.व्ही. धुळे उपकेंद्र व ४०० के.व्ही. लोणीकंद उपकेंद्रामध्ये STATCOM स्थापनेचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यात आला असून दि. ०४.०४.२०२५ रोजीच्या १७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. ब) प्रस्तावित ७६५ के.व्ही. महापे उपकेंद्रामध्ये STATCOM प्रकल्प TBCB अंतर्गत वर्ग करण्यात आला आहे. तपशील	-
२	अस्तित्वात असलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांचे हाय परफॉर्मन्स कंडक्टरने क्षमता वृद्धिकरण करणे. रु . १५४९.२७ कोटी किमतीच्या १०२२.०२ सर्किट कि.मी.च्या नवीन योजना तयार करणे	पूर्ण	एकूण १३४४ सर्किट कि.मी. हाय परफॉर्मन्स कंडक्टर (HPC) वाहिन्यांच्या योजना तयार केल्या आहेत, त्यापैकी: अ) एकूण १४८ सर्किट कि.मी. वाहिन्यांचे दि. १७.०१.२०२५ रोजीच्या १७० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून कार्यादेश देण्यात आले आहे. ब) एकूण ७१८ सर्किट कि.मी. वाहिन्यांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दि. ०४.०४.२०२५ रोजीच्या १७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदांना मान्यता मिळाली आहे. क) एकूण ३९२ सर्किट कि.मी. वाहिन्यांच्या योजनांना दि. १७.०१.२०२५ रोजीच्या १७० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजूरी मिळाली असून निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. ड) एकूण ८६ सर्किट कि.मी. वाहिन्यांच्या योजनांना दि. ०४.०४.२०२५ रोजीच्या १७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तपशील	-

महापारेषण



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
३	एअर इन्सुलेटेड स्विचगियर (AIS) चे गॅस इन्सुलेटेड स्विचगियर (GIS) मध्ये रूपांतरण करणे. १० प्रकल्पांची निवड करून निविदा प्रक्रिया सुरु करणे.	पूर्ण	अ) एकूण १३ उपकेंद्रांची निवड करण्यात आली असून DPR तयार करण्यात आला आहे. ब) सदर DPR ला दि. ०४.०४.२०२५ रोजीच्या १७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून, दि. १२ व १६ एप्रिल २०२५ रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. तपशील	-
४	महापारेषण प्रणालीत रिअॅक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे. रु. ३४४.३५ कोटी किमतीच्या ३५०० एम.व्ही.ए.आर च्यारिअॅक्टीव्ह (कपॅसिटर) पॉवर कम्पेंसेशन योजनांसाठी निविदा व कार्यादेश जारी करणे	पूर्ण	३५०० एम.व्ही.ए.आर कपॅसिटर बँक करिता कार्यादेश देण्यात आले आहेत. तपशील	-
५	महापारेषण प्रणालीत रिअॅक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे. सध्याच्या ४०७५एम.व्ही.ए.आर (रिअॅक्टर) च्या स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत, २४६.२६ कोटी किमतीच्या १४४५ एम.व्ही.ए.आर च्या निविदा मागवणे	पूर्ण	अ) १२८५ एम.व्ही.ए.आर. रिअॅक्टर करिता दि. ०४.०४.२०२५ रोजीच्या १७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून, दि. ०५, ०७, ०९ व १२ एप्रिल २०२५ रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. ब) १६० एम.व्ही.ए.आर. रिअॅक्टर करिता दि. ११.०४ २०२५ रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. तपशील	-
६	नविन अति उच्चदाब प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया राबवणे रु. ४३८.५१ कोटीच्या एकूण ०४ प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर करून कार्यादेश देणे. शिवाय रु. ६५० कोटीच्या १३ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे.	पूर्ण	अ) रु. ४३८.५१ कोटीच्या एकूण ०४ प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर करून (२२० के.व्ही. येनवा, ४०० के.व्ही. नांदगांव पेठ, २२० के.व्ही. कामण GIS व २२० के.व्ही. बीडकीन GIS) कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. ब) रु. ६५० कोटीच्या १३ निविदांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत.	-

महापारेषण



महाराष्ट्र शासन


अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
७	महाराष्ट्रात SCED पायलट प्रकल्प सुरु करणे.			
	१. SCED पायलटच्या अंमलबजावणीसाठी MERC च्या मान्यतेसाठी याचिका दाखल करणे.	पूर्ण	महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने माननीय MERC कडे दिनांक २०.०३.२०२५ रोजी याचिका दाखल केली. तथा माननीय MERC ने दिनांक २५.०३.२०२५ तारखेच्या नोटीसद्वारे याचिका क्रमांक.- ५१/MP/२०२५ या क्रमांकाने नोंद केली आहे. महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने त्वरित सुनावणीसाठी माननीय आयोगाकडे दिनांक ०३.०४.२०२५ रोजी अर्ज क्रमांक- ४३/ IA / २०२५ in याचिका क्रमांक. ५१/MP/२०२५ दाखल केलेला आहे. त्या अनुषंगाने माननीय MERC ने दिनांक २९.०४.२०२५ रोजी सुनावणी सुनिश्चित केली आहे.	-
	२. SCED पायलट प्रकल्पासाठी सिस्टम आर्किटेक्चर डिझाइन करणे. यामध्ये आवश्यक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर घटक, डेटा प्रवाह आणि विद्यमान सिस्टम आणि SCED मॉड्यूलमधील इंटरफेस निश्चित करणे समाविष्ट आहे.	पूर्ण	SCED पायलट प्रकल्पासाठीचे आर्किटेक्चर डिझाइन निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी विद्यमान सिस्टम आणि SCED यामधील इंटरफेसचे स्वरूपही ठरवण्यात आले आहे.	-
	३. आवश्यक मानवी संसाधनांची निवड आणि वाटप	पूर्ण	आवश्यक मानवी संसाधनांची निवड आणि वाटप केले आहे.	-
	४. विद्यमान सिस्टमशी डेटा इंटरफेसिंगसाठी संबंधित विकासासाठी एजन्सी निश्चित करणे.	पूर्ण	विद्यमान सिस्टमशी डेटा इंटरफेसिंगसाठी विकास एजन्सीची निवड झालेली आहे.	-
	५. अंतर्गत संसाधनांची क्षमता वाढवणे.	पूर्ण	अंतर्गत संसाधनांची व्यवस्था झालेली आहे. क्षमता राज्य वीज नियामक मंडळाच्या मंजूरी नंतर वाढवणेत येईल.	-

महापारेषण



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
८	राज्य पारेषण उपक्रम (STU) कडून TBCB (Tariff Based Competitive Bidding) पद्धतीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्याने पारेषण प्रकल्पांची आखणी करणे.	पूर्ण	दि. ०३.०१.२०२५ रोजी ५ प्रकल्पांची निवड करून उक्त प्रकल्पाला TBCB द्वारे राबविण्याकरिता अधिकार प्राप्त समितीने मंजुरी दिली आहे. इतिवृत्त १७.०१.२०२५, २०.०३.२०२५	-
९	आंतर-राज्य पारेषण प्रणालीला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांवर आधारित प्रकल्पांना ग्रीड जोडणी मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे.	पूर्ण	सदर योजनेची अंमलबजावणी ०७ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. सूचना	-
१०	परावर्तन क्षमतेत वाढ करणे in MSETCL Network रु. १४७३ कोटी किमतीच्या १०५५५ एम.व्ही.ए च्या योजनांसाठी निविदा जारी करण्याचे नियोजन आहे.	पूर्ण	निविदा माहे फेब्रुवारी मध्ये जारी करण्यात आल्या आहेत. तपशील	-
११	नवीन प्रकल्प योजनांच्या अचूक आणि सुस्पष्ट सूत्रीकरणासाठी २५०० कोटी रुपयांचे ०९ प्रकल्प प्रशासकीय मंजुरी आणि एमईआरसी मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहेत	पूर्ण	रु. २८०० कोटी किमतीच्या ८ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यांचे प्रस्ताव मा. वीज नियामक आयोगाकडे लवकरच पाठविण्यात येत आहेत. तसेच एका प्रकल्पाची किंमत रु. २०० कोटींच्या वर जात असल्याने MERC MYT Regulation २०२४ अनुसार STU कडून TBCB अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. तपशील	-



महाऊर्जा



महाराष्ट्र शासन

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ ई. अभिलेख	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
१	इ.सी.बी. सी. नियमावली प्रकाशित करणेबाबत	पूर्ण	महाराष्ट्र ऊर्जा संवर्धन इमारत नियम २०२५ दि. २९.०८.२०२५ रोजी	-
२	हरकती आणि सूचना मागविणेबाबत	पूर्ण	राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी	
३	प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनांचे अंतिम स्वरूप	पूर्ण	शासकीय मुद्रणालयास पाठवण्यात आले आहे .	
४	महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण - अँकर युनिटसाठी RFS प्रकाशित करणे.	पूर्ण	महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण अंतर्गत अँकर युनिटसाठी निविदा दि. ३०.०८.२०२५ रोजी प्रसिध्दकरण्यात आली आहे.	-
५	१५० शासकीय इमारतीवर रुफ टॉप सोलर आस्थापित करण्यात येतील.	पूर्ण	याबाबत महाऊर्जाकडून प्राप्त विवरणपत्र सोबत जोडले आहे.	-
६	१४९७ शासकीय इमारतींवर रुफ टॉप सोलर बसविण्यासाठी LOA देण्यात येतील.	अपूर्ण		२०४९ शासकीय इमारतीचे (एकूण ६१.४१६ मे.वॅ. क्षमतेच्या) सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५६३ शासकीय इमारतीचे (एकूण १२.४४७मे.वॅ. क्षमतेच्या) सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून सदर ४९७ (११.३५४ मे.वॅ.) शासकीय इमारतीसाठी ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७४ शासकीय इमारतींची LOA निर्गमित करण्यात आले असून उर्वरित ३८९ शासकीय इमारतींची ई-निविदाची कार्यवाही पूर्ण करून दि.३०/५/२०२५ पर्यंत LOA निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. १४९७ पैकी उर्वरीत ९३४ इमारतींचे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ४० दिवसांच्या कालावधी मध्ये ई-निविदा कार्यवाही पूर्ण करून दि.३०/६/२०२५ पर्यंत LoA देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
	एकूण संख्या ऊर्जा विभाग -४१		एकूण पूर्ण कामांची संख्या - ४०	एकूण अपूर्ण कामांची संख्या -१



महाराष्ट्र शासन

धन्यवाद..!

ऊर्जा विभाग
महाराष्ट्र शासन

महावितरण : नवीन उपकेंद्र यादी व फोटो (१/४)



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	New Sub-Station	Capacity of S/s	Target Month	Date of Completion
1	Ahilyanagar	Chikhali	1X5 MVA	Jan 2025	21-01-2025
2	Ahilyanagar	Shiral	1X5 MVA	Feb 2025	13-02-2025
3	Ahilyanagar	Dhangarwadi	1X5 MVA	Feb 2025	22-02-2025
4	Amravati	Akoli	1X5 MVA	Feb 2025	22-01-2025
5	Beed	Daundwadi	1X5 MVA	Jan 2025	21-01-2025
6	Ch.Sambhaji Nagar	Chandgaon	1X5 MVA	Feb 2025	27-02-2025
7	Dhule	Vaskhedi	1X5 MVA	Jan 2025	31-01-2025
8	Gondia	Khodshiwani	1X5 MVA	March 2025	29-03-2025
9	Jalgaon	Hingana	1X5 MVA	Mar 2025	10-03-2025
10	Jalgaon	Sarbete	1X5 MVA	Jan 2025	25-01-2025
11	Jalgaon	kakadnae	1X5 MVA	March 2025	15-04-2025
12	Jalgaon	Shelave	1X5 MVA	Apr-25	31-03-2025
13	Kalyan	Regency	1X5 MVA	March 2025	09-03-2025
14	Kolhapur	Niwade	1X5 MVA	Feb 2025	05-03-2025
15	Kolhapur	Murgud	1X5 MVA	Jan 2025	27-01-2025
16	Kolhapur	Rukadi	2X5 MVA	Feb 2025	28-02-2025
17	Kolhapur	Masewadi	1X5 MVA	Jan 2025	26-01-2025
18	Kolhapur	Mahalaxmi	1X5 MVA	Feb 2025	24-01-2025
19	Kolhapur	Karekundi	1X5 MVA	Feb 2025	10-01-2025
20	Kolhapur	Jargi	1X5 MVA	Feb 2025	05-01-2025
21	Latur	Chincholiraowadi	1X5 MVA	Feb 2025	02-03-2025

BACK

महावितरण : नवीन उपकेंद्र यादी (२/४)



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	New Sub-Station	Capacity of S/s	Target Month	Date of Completion
22	Latur	Malumbra	1X5 MVA	March 2025	05-03-2025
23	Nagpur	Butibori	1X5 MVA	Feb 2025	28-01-2025
24	Nagpur	Shiv Kailas	1X5 MVA, 1X10 MVA	Mar 2025	10-03-2025
25	Nandurbar	Revanagar	1X5 MVA	Feb 2025	20-03-2025
26	Nashik	Chikhalohol	1X5 MVA	Jan 2025	15-01-2025
27	Nashik	Jirwade	1X5 MVA	March 2025	26-02-2025
28	Nashik	Kukane	1X5 MVA	Feb 2025	25-01-2025
29	Nashik	Nagarsul	1X5 MVA	Feb 2025	25-02-2025
30	Nashik	Daregaon	1X5 MVA	March 2025	06-03-2025
31	Pune	Karawagaj	1X5 MVA	Jan 2025	27-12-2024
32	Pune	Penjalwadi	1X5 MVA	Jan 2025	28-01-2025
33	Pune	Diwa	1X5 MVA	Jan 2025	12-12-2024
34	Pune	Dahiwadi	2X5 MVA	Jan 2025	25-01-2025
35	Pune	Boriandi	1X5 MVA	Feb 2025	09-03-2025
36	Pune	Pune Embassy	1X5 MVA	Feb 2025	26-02-2025
37	Sangli	Kundal	1X5 MVA	Feb 2025	07-03-2025
38	Sangli	Wazar	1X5 MVA	Feb 2025	23-01-2025
39	Sangli	Kokale	1X5 MVA	March 2025	04-03-2025
40	Satara	Wadale	1X5 MVA	Jan 2025	07-01-2025
41	Solapur	Pokharapur	1X5 MVA	Apr-25	16-04-2025
42	Thane	Bamandongri	1X5 MVA	Feb 2025	25-02-2025

BACK

महावितरण : नवीन उपकेंद्र फोटो (३/४)



महाराष्ट्र शासन



BACK

महावितरण : नवीन उपकेंद्र फोटो (४/४)



महाराष्ट्र शासन



BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (१/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
1	CHH. SAMBHAJINAGAR	CH. SAMBHAJINAGAR(R) II DIVN.	33/11 KV SHENDURWADA	ADDL	11-01-2025
2	CHH. SAMBHAJINAGAR	CH. SAMBHAJINAGAR(R) II DIVN.	33/11 KV WALUJGAON SUB- ST	AUG	17-01-2025
3	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	MAHALGAON	AUG	14-10-2024
4	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	LADGOAN	AUG	19-11-2024
5	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	NAGAMTHAN	AUG	03-02-2025
6	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	33/11KV SHIVRAI	AUG	19-11-2024
7	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	33/11 Kv Chinchadgaon	AUG	14-10-2024
8	CHH. SAMBHAJINAGAR	KANNAD DIVISION	33/11 LONI	AUG	14-10-2024
9	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	33 KV BARDAPUR	ADDL	17-01-2025
10	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	JAWALGAON 33/11 KV	ADDL	25-03-2025
11	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	NANDURGHAT	ADDL	21-03-2025
12	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	33/11 KV H.PIMPRI SS	ADDL	10-03-2025
13	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	33KV UMARI	ADDL	05-04-2025
14	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	33/11 KV POHONER S/S	AUG	17-01-2025
15	BEED	AMBEJOGAI DIVISION	33/11 KV DHARMAPURI	AUG	18-11-2024
16	BEED	BEED DIVISION	33/11KV PADALSINGI S/S	AUG	11-01-2025
17	BEED	BEED DIVISION	33/11 KV RAIMOHA	ADDL	13-02-2025
18	BEED	BEED DIVISION	33/11 KV. BR. YALLAM S/S	AUG	12-02-2025
19	BEED	BEED DIVISION	33/11 KV KHALAPURI	ADDL	13-02-2025
20	DHARASHIV	DHARASHIV DIVISION	33/11 kv DHAGPIMPARI SUB STATI	ADDL	15-10-2024
21	DHARASHIV	TULJAPUR DIVISION	JEWALI	AUG	11-02-2025
22	DHARASHIV	TULJAPUR DIVISION	33/11 KV SAWARGAO S/S	AUG	15-02-2025
23	LATUR	LATUR DIVISION	33/11 KV BABHALGAON	AUG	03-01-2025
24	LATUR	LATUR DIVISION	33/11 KV TAKALI	AUG	12-01-2025
25	LATUR	NILANGA DIVISION	33KV NAGAARSOGA S/S	ADDL	17-04-2025

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (२/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
26	LATUR	NILANGA DIVISION	33/11 KV PANCHINCHOLI	ADDL	12-04-2025
27	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11 KV UJANA	AUG	11-02-2025
28	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11 KV CHAKUR S/S	AUG	29-03-2025
29	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11 DEVANGARA	ADDL	26-04-2025
30	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11 KV HADOLTI SUBSTATION	AUG	12-02-2025
31	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11KV HALI SUBSTATION	AUG	22-03-2025
32	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11KV KUMTHA SUBSTATION	ADDL	02-04-2025
33	LATUR	UDGIR DIVISION	33/11KV DONGRAJ SUBSTATION	ADDL	12-02-2025
34	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33 KV ADGAON	AUG	10-12-2024
35	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33 KV KHANAPUR CHITTA	AUG	30-11-2024
36	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33/11 KV WARANGA	AUG	25-03-2025
37	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33/11 KV AKHADA BALAPUR	AUG	05-12-2024
38	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33 KV GOREGAON	AUG	12-12-2024
39	HINGOLI	HINGOLI DIVSION	33 KV KHILLAR SUB-STATION	AUG	01-12-2024
40	NANDED	BHOKAR DIVSION	ASHTI	AUG	04-03-2025
41	DHULE	DHULE RURAL DIVISION	33/11 KV JUNWANE	ADDL	24-12-2024
42	DHULE	DHULE RURAL DIVISION	33/11 KV DAHIWEL	AUG	26-04-2025
43	DHULE	DHULE RURAL DIVISION	33/11 KV CHHAWADI	AUG	23-03-2025
44	DHULE	DHULE URBAN DIVISION	NAVALNAGAR	AUG	11-03-2025
45	DHULE	DHULE URBAN DIVISION	33/11 KV SUB SONGIR	AUG	07-04-2025
46	DHULE	DONDAICHA DIVISION	33/11KV INDAVE	AUG	10-03-2025
47	DHULE	DONDAICHA DIVISION	33/11KV MALPUR SUBSTATION	AUG	08-03-2025
48	JALGAON	BHUSAWAL DIVISION	33/11 KV CHORWAD	AUG	10-03-2025
49	JALGAON	DHARANGAON DIVISION	33/11 KV ADAWAD	AUG	03-03-2025
50	JALGAON	DHARANGAON DIVISION	33/11 KV MOHIDA S/STN	AUG	08-01-2025

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (३/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
51	JALGAON	MUKTAINAGAR DIVISION	33/11 KV PURNAD S/STN	AUG	16-03-2025
52	JALGAON	PACHORA DIVISION	33/11 KV LOHARA	ADDL	29-03-2025
53	JALGAON	SAVADA DIVISION	33/11 KV BAKSHIPUR S/S	AUG	12-03-2025
54	NANDURBAR	NANDURBAR (O&M) DIVISION	33/11 KV KHANDBARA S/S	AUG	17-01-2025
55	NANDURBAR	SHAHADA DIVISION	MANDANA	ADDL	13-02-2025
56	NANDURBAR	SHAHADA DIVISION	SARANGKHEDA	AUG	27-01-2025
57	NANDURBAR	SHAHADA DIVISION	33 KV Kukawal	AUG	30-01-2025
58	NANDURBAR	SHAHADA DIVISION	PARIVARDHA	AUG	03-01-2025
59	NANDURBAR	SHAHADA DIVISION	DAMERKHEDA	AUG	31-01-2025
60	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR RURAL DIVISION	33/11 KV SONAI	AUG	05-12-2024
61	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR RURAL DIVISION	33/11 KV WADALA	AUG	15-01-2025
62	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR RURAL DIVISION	33/11 KV TISGAON	AUG	19-10-2024
63	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR RURAL DIVISION	33/11KV DHORJALGAON	AUG	21-11-2024
64	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR RURAL DIVISION	33/11KV BALAMTAKLI	ADDL	20-02-2025
65	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR URBAN DIVISION	33/11KV RUI CHHATTISHI S/S	ADDL	21-11-2024
66	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR URBAN DIVISION	33/11 KV KHADAKWADI	ADDL	16-04-2025
67	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR URBAN DIVISION	33/11 Kv Goregaon	ADDL	11-04-2025
68	AHEMADNGAR	AHILYANAGAR URBAN DIVISION	33/11 KV WARANWADI	ADDL	11-04-2025
69	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11KV BELWANDI	ADDL	12-03-2025
70	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 kv PARGAON	ADDL	24-04-2025
71	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 KV SAKAT SUBSTATION	ADDL	18-03-2025
72	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 KV KARJAT	ADDL	24-04-2025
73	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 KV KHED	AUG	12-12-2024
74	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 KV GANESHWADI SUBSTATION	AUG	19-12-2024
75	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11KV TANDALI D	ADDL	25-03-2025

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (४/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
76	AHEMADNGAR	KARJAT (R) DIVISION	33/11 KV ANGARE	ADDL	21-02-2025
77	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33 / 11 KV VIRGAON SUB STATION	ADDL	26-03-2025
78	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV TALEGAOM MALE	AUG	21-12-2024
79	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV RAJUR	AUG	02-02-2025
80	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV SHENDI	AUG	23-01-2025
81	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33 /11 KV WHAGAPUR SS	AUG	07-12-2024
82	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV SAKUR	AUG	06-01-2025
83	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV KOKANGAON	AUG	17-12-2024
84	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV KARJULEPATHAR	ADDL	07-04-2025
85	AHEMADNGAR	SANGEMNER DIVISION	33/11 KV BOTA	AUG	22-11-2024
86	AHEMADNGAR	SHRIRAMPUR RURAL DIVISION	33/11KV SATRAL SUBSTATION	ADDL	04-02-2025
87	AHEMADNGAR	SHRIRAMPUR RURAL DIVISION	33/11 KV TAKALIBHAN	AUG	07-02-2025
88	MALEGAON	KALWAN DIVISION	DEOLA	AUG	25-02-2025
89	MALEGAON	KALWAN DIVISION	KHARDE	AUG	14-04-2025
90	MALEGAON	KALWAN DIVISION	DESRANE	ADDL	09-04-2025
91	MALEGAON	KALWAN DIVISION	CHANKAPUR	ADDL	29-03-2025
92	MALEGAON	MALEGAON URBAN DIVISION	33/11 KV TALWADE	ADDL	29-03-2025
93	MALEGAON	MALEGAON URBAN DIVISION	33/11 KV SAUNDANE	ADDL	29-03-2025
94	MALEGAON	MALEGAON URBAN DIVISION	33/11 KV UMARANE	ADDL	08-03-2025
95	MALEGAON	MANMAD RURAL DIVISION	VEHEL GAON	AUG	13-01-2025
96	MALEGAON	MANMAD RURAL DIVISION	VIKHARNI	AUG	13-01-2025
97	MALEGAON	SATANA DIVISION	33/11 KV ASKHEDA	ADDL	24-04-2025
98	MALEGAON	SATANA DIVISION	33 /11 KV MULHER	AUG	13-01-2025
99	MALEGAON	SATANA DIVISION	AJMERSAUNDANE	ADDL	16-04-2025
100	NASIK (U)	NASIK RURAL DIVISION	33/11 KV VANI	AUG	08-12-2024

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (५/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
101	NASIK (U)	NASIK RURAL DIVISION	SAKUR	ADDL	28-03-2025
102	NASIK (U)	NASIK RURAL DIVISION	PATHARE	AUG	16-01-2025
103	AKOLA	AKOLA RURAL DIVISION	33 KV MAHAN STN	ADDL	10-02-2025
104	BULDHANA	BULDHANA DIVISION	33KV SAKHARKHERDA	AUG	12-12-2024
105	BULDHANA	BULDHANA DIVISION	33/11 KV EKLARA	ADDL	22-04-2025
106	BULDHANA	KHAMGAON CONSTRUCTION DIV	33/11 KV JANEFAL	AUG	03-12-2024
107	BULDHANA	KHAMGAON CONSTRUCTION DIV	33/11 KV DEULGAON SAKARSHA SU	AUG	29-11-2024
108	BULDHANA	MALKAPUR DIVISION	33 KV SUBSTATION SAWARGAON	AUG	28-12-2024
109	BULDHANA	MALKAPUR DIVISION	33 KV Pophli S/S	ADDL	21-04-2025
110	BULDHANA	MALKAPUR DIVISION	33 KV CHANDUR S/S	AUG	20-01-2025
111	BULDHANA	MALKAPUR DIVISION	33 KV MAHALUNGI S/S	ADDL	19-04-2025
112	WASHIM	WASHIM DIVISION	33/11 KV PETHKHADANPUR S/S	ADDL	09-04-2025
113	WASHIM	WASHIM DIVISION	33/11 KV WAI SUB-STATION	ADDL	11-02-2025
114	YAVATMAL	PUSAD DIVISION	33 KV SHEMBALPIMPRI	AUG	19-04-2025
115	YAVATMAL	PUSAD DIVISION	33 KV CHONDHI	ADDL	01-03-2025
116	YAVATMAL	YAVATMAL DIVISION	33/11 KV GPDHANI S/S	ADDL	15-01-2025
117	GADCHIROLI	GADCHIROLI DIVISION	33/11 KV SHANKARPUR (WADSA) S/	AUG	11-12-2024
118	BHANDARA	BHANDARA DIVISION	33 KV GADEGAON	AUG	27-03-2025
119	GONDIA	GONDIA DIVISION	33/11 KV GOREGAON	AUG	12-02-2025
120	NAGPUR (R)	SAONER DIVISION	33 KV KHPA	AUG	23-04-2025
121	BARAMATI	BARAMATI DIVISION	33/11KV BAWADA	AUG	21-03-2025
122	BARAMATI	BARAMATI DIVISION	33/11 KV MURTI	ADDL	20-03-2025
123	BARAMATI	DOUND DIVISION	33/11 KV Kanhur Mesai	AUG	28-11-2024
124	SOLAPUR	AKLUJ O&M DIVISION	33/11KV VELAPUR	AUG	28-10-2024
125	SOLAPUR	AKLUJ O&M DIVISION	VITTHALWADI	AUG	20-12-2024

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (६/८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
126	SOLAPUR	AKLUJ O&M DIVISION	33/11kv MALSHIRAS S/Stn	ADDL	22-11-2024
127	SOLAPUR	AKLUJ O&M DIVISION	33/11KV ISLAMPUR S/STN	AUG	30-10-2024
128	SOLAPUR	AKLUJ O&M DIVISION	33KV KACHREWADI S/STN	AUG	19-12-2024
129	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV UPALE (D)	ADDL	19-10-2024
130	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV SUBSTATION SADE (SO S	AUG	01-07-2024
131	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV LAVHE	ADDL	29-03-2025
132	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV MANGI S/S	AUG	26-03-2025
133	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV VEET S/S	ADDL	06-01-2025
134	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV UPALAI SUB STATION	ADDL	25-04-2025
135	SOLAPUR	BARSI DIVISION	ADHEGAON	AUG	25-10-2024
136	SOLAPUR	BARSI DIVISION	BEMBALE	AUG	17-10-2024
137	SOLAPUR	BARSI DIVISION	PARITE	AUG	02-04-2025
138	SOLAPUR	BARSI DIVISION	33/11 KV BHEND SUB STATION	ADDL	30-10-2024
139	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV KOLA	ADDL	08-04-2025
140	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV UDANWADI	AUG	01-09-2024
141	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV CHOPADI	ADDL	06-01-2025
142	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV NIJAMPUR(MANEGAON)	ADDL	28-04-2025
143	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV BHALWANI SUBSTATION	AUG	23-10-2024
144	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV GURSALE	ADDL	03-01-2025
145	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV KARKAMB	AUG	23-10-2024
146	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV PAT KUROLI	AUG	12-12-2024
147	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV UMBRE	AUG	09-04-2025
148	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV KAROLE	AUG	21-04-2025
149	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV ACHAKDANI	AUG	23-04-2025
150	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV MAHUD	AUG	20-09-2024

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (७ / ८)



महाराष्ट्र शासन

SR NO	District	MSEDCL DIVISION	SUBSTATION NAME	TF ACTIVITY	DATE OF COMMISSIONING
151	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV MANJARI	ADDL	02-04-2025
152	SOLAPUR	PANDHARPUR DIVISION	33/11 KV KATAFAL	ADDL	25-10-2024
153	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV TADWAL SUBSTATION	AUG	11-04-2025
154	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV BEGAMPUR	AUG	18-09-2024
155	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV KAMTI	ADDL	28-03-2025
156	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 TAKALI SIKANDAR	AUG	17-10-2024
157	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV DEWADI	ADDL	08-04-2025
158	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV HIVARE S/S	ADDL	17-03-2025
159	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV AKOLEKATI	ADDL	03-03-2025
160	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV BIBI DARPAL	ADDL	26-01-2025
161	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11 KV ANTROLI	ADDL	28-04-2025
162	SOLAPUR	SOLAPUR RURAL DIVISION	33/11KV BHANDKAWATHE	AUG	09-12-2024
163	KOLHAPUR	JAYASINGPUR DIVISION	33/11 KV SAWARDE S/STN	ADDL	26-03-2025
164	KOLHAPUR	KOLHAPUR RURAL I DIVISION	33/11KV VETAVADE S/STN	AUG	27-12-2024
165	KOLHAPUR	KOLHAPUR RURAL I DIVISION	33/11 KV KANCHANWADI	AUG	30-03-2025
166	KOLHAPUR	KOLHAPUR RURAL II DIV.	33/11 KV SOLANKUR S/S	AUG	31-03-2025
167	SANGLI	ISLAMPUR DIVISION	33/11 KV RETHRE HARNAX STN	AUG	15-04-2025
168	SANGLI	KAVATHEMAHANKAL DIVISION	33/11 KV BILLUR S/STN	AUG	25-02-2025
169	SANGLI	KAVATHEMAHANKAL DIVISION	33/11 KV PACHAPUR	ADDL	26-03-2025
170	SANGLI	KAVATHEMAHANKAL DIVISION	33/11KV Borgaon	AUG	11-02-2025
171	SANGLI	KAVATHEMAHANKAL DIVISION	33/11 KV BORGI	AUG	04-02-2025
172	SANGLI	KAVATHEMAHANKAL DIVISION	33/11 KV UMADI	AUG	31-12-2024
173	SANGLI	VITA DIVISION	33/11 KV PALUS SUB-STATION	ADDL	29-03-2025
174	PUNE (R)	MANCHAR O&M DIVISION	33/11KV NIRGUDSAR	ADDL	24-01-2025
175	PUNE (R)	MANCHAR O&M DIVISION	33 KV PARGAON MANGRUL	ADDL	17-02-2025

BACK

महावितरण : उपकेंद्र क्षमतावाढ यादी व फोटो (८/८)



महाराष्ट्र शासन



33/11 KV JANEFAL Sstn.



Janephal, Maharashtra, India
7hrf+53h, Janephal, Maharashtra 443304, India
Lat 20.290148° Long 76.572812°
01/05/2025 02:01 PM GMT +05:30



Buldhana, Maharashtra, India
, Maharashtra 443304, India, Buldhana,
Maharashtra 443304, India
Lat 20.404587° Long 76.71046°
01/05/2025 02:23 PM GMT +05:30



33/11 KV Gadegaon

SS

BACK

महावितरण : वाहिनी पृथक्करण



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	No. of Feeders
1	Ahilyanagar	25
2	Akola	8
3	Amravati	18
4	Beed	15
5	Bhandara	7
6	Chandrapur	20
7	Ch. Sambhajinagar	4
8	Dharashiv	12
9	Dhule	3
10	Gadchiroli	16
11	Gondia	11
12	Jalgaon	19
13	Jalna	15
14	Kolhapur	8

Sr. No.	District	No. of Feeders
15	Latur	55
16	Malegaon	15
17	Nagpur	21
18	Nanded	31
19	Nandurbar	2
20	Nashik	28
21	Palghar	1
22	Parbhani	35
23	Pune	27
24	Satara	2
25	Sindhudurg	2
26	Solapur	28
27	Thane	1
28	Wardha	21
Total		450

BACK

महावितरण : वाहिनी पृथक्करण



महाराष्ट्र शासन



BACK

महावितरण: वाहिनी विभाजन



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	Feeder Bifurcation (Ckt. km)	Nos. of Locations
1	Buldhana	28	6
2	Akola	6	1
3	Washim	8	2
4	Amravati	5	2
5	Yavatamal	41	6
6	Wardha	0	0
7	Nagpur	0	0
8	Bhandara	25	7
9	Gondia	32	8
10	Gadchiroli	16	4
11	Chandrapur	10	2
12	Ch. Sambhajinagar	18	3
13	Hingoli	0	0
14	Parbhani	0	0
15	Jalna	30	6
16	Nanded	120	20
17	Beed	189	23

Sr. No.	District	Feeder Bifurcation (Ckt. km)	Nos. of Locations
18	Latur	29	5
19	Dharashiv	100	24
20	Nandurbar	1	1
21	Dhule	1	1
22	Jalgaon	18	3
23	Nashik	13	2
24	Ahmednagar	110	28
25	Thane	24	5
26	Raigad	3	1
27	Palghar	8	2
28	Solapur	61	9
29	Satara	69	8
30	Kolhapur	7	2
31	Sangli	27	5
32	Ratnagiri	18	4
33	Sindhudurg	27	4
34	Pune	60	6
Total		1101	199

[BACK](#)

महावितरण : वाहिनी विभाजन



महाराष्ट्र शासन



Sawangi, Maharashtra, India
Mwcr+v9f, Sawangi, Maharashtra 441207, India
Lat 20.672204° Long 79.941391°
07/04/25 03:32 PM GMT +05:30

OSM Map Camera



BACK

महावितरण: वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात केबल (AB Cable) टाकणे



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	AB Cable (Ckt. km)	Nos. of Locations
1	Buldhana	531	80
2	Akola	375	94
3	Washim	304	76
4	Amravati	86	21
5	Yavatamal	186	46
6	Wardha	51	13
7	Nagpur	110	28
8	Bhandara	104	26
9	Gondia	220	55
10	Gadchiroli	207	52
11	Chandrapur	131	33
12	Ch. Sambhajinagar	135	34
13	Hingoli	135	33
14	Parbhani	139	35
15	Jalna	174	43
16	Nanded	338	84
17	Beed	126	35

Sr. No.	District	AB Cable (Ckt. km)	Nos. of Locations
18	Latur	223	56
19	Dharashiv	172	43
20	Nandurbar	57	14
21	Dhule	92	23
22	Jalgaon	281	70
23	Nashik	208	52
24	Ahmednagar	360	90
25	Thane	128	32
26	Raigad	55	14
27	Palghar	204	51
28	Solapur	347	87
29	Satara	179	45
30	Kolhapur	30	8
31	Sangli	160	40
32	Ratnagiri	16	4
33	Sindhudurg	12	3
34	Pune	304	76
Total		6180	1492

[BACK](#)

महावितरण : वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात केबल टाकणे



महाराष्ट्र शासन



महावितरण: नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलणे (निरंतर वीज योजना)



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	Achievement
1	AHMEDNAGAR	87
2	AKOLA	166
3	AMRAVATI	320
4	BEED	268
5	BHANDARA	40
6	BULDANA	276
7	CH.SAMBHAJINAGAR	652
8	CHANDRAPUR	49
9	DHARASHIV	100
10	DHULE	90
11	GADCHIROLI	40
12	GONDIA	70
13	HINGOLI	103
14	JALGAON	92
15	JALNA	143
16	KOLHAPUR	170
17	LATUR	269

Sr. No.	District	Achievement
18	NAGPUR	125
19	NANDED	301
20	NANDURBAR	0
21	NASHIK	175
22	PALGHAR	0
23	PARBHANI	262
24	PUNE	343
25	RAIGAD	60
26	RATNAGIRI	0
27	SANGLI	322
28	SATARA	283
29	SINDHUDURG	25
30	SOLAPUR	200
31	THANE	31
32	WARDHA	25
33	WASHIM	65
34	YAVATMAL	90
Grand Total		5242

[BACK](#)

महावितरण : नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलणे



महाराष्ट्र शासन



GPS Map Camera

DTC CODE- 4274351
DTC NAME- OZAR ROAD DP
SECTION- CHANDORI RURAL
SUB DN- OZAR
TALUKA- NIPHAD
DIST- NASHIK


Narayangaon, Maharashtra, India
Ganesh Sangamner Rd, Narayangaon, Maharashtra
422302, India
Lat 20.057794° Long 73.958672°
24/04/2025 02:27 PM GMT +05:30



Google

Saykheda, Maharashtra, India
227m+6j7, Saykheda, Maharashtra
422302, India
Lat 20.010706° Long 73.958672°
24/04/2025 02:07 PM GMT +05:30

DTC code - 2740819
DTC name - mhasoba
DP
Subdivision - ozar
Section - saikheda
Taluka - niphad
Dist - Nashik

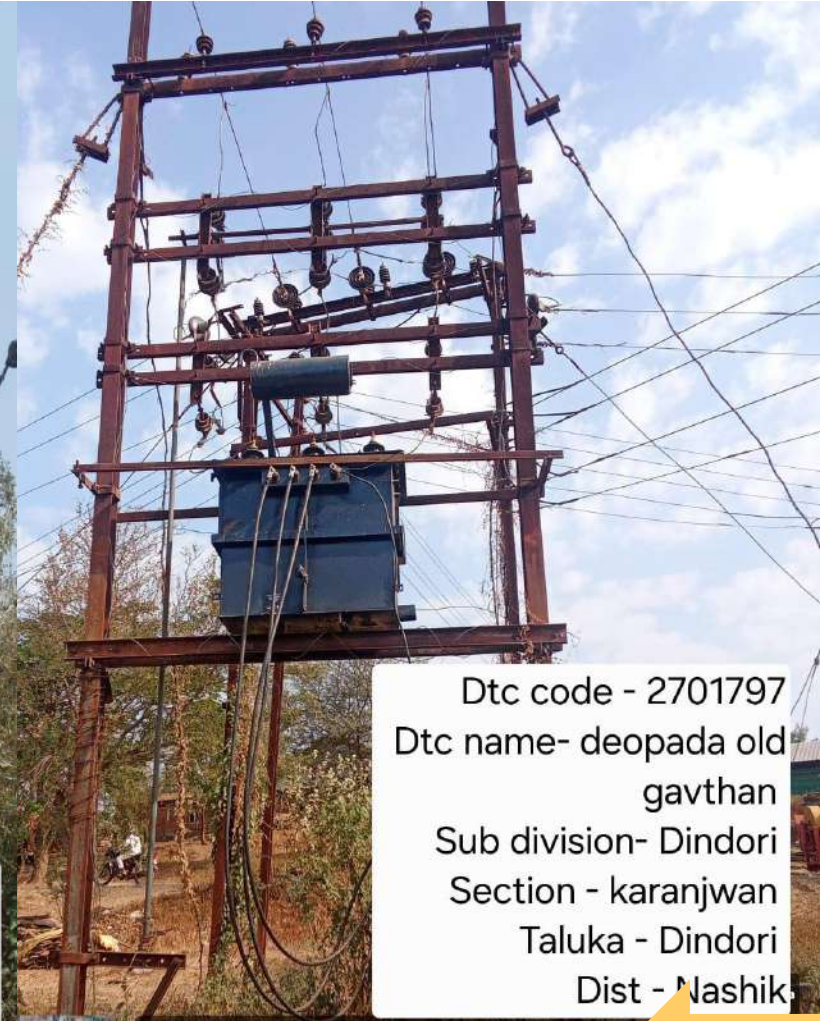

Dtc code - 2701797
Dtc name- deopada old
gavthan
Sub division- Dindori
Section - karanjwan
Taluka - Dindori
Dist - Nashik

Deopada, Maharashtra, India
Cp5h+3c4, Deopada, Maharashtra 422202, India
Lat 20.407132° Long 73.727903°
24/04/2025 08:46 AM GMT +05:30

BACK

महावितरण : नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलणे



महाराष्ट्र शासन



GPS Map Camera

DTC CODE- 4274351
DTC NAME- OZAR ROAD DP
SECTION- CHANDORI RURAL
SUB DN- OZAR
TALUKA- NIPHAD
DIST- NASHIK


Narayangaon, Maharashtra, India
Ganesh Sangamner Rd, Narayangaon, Maharashtra
422302, India
Lat 20.057794° Long 73.958672°
24/04/2025 02:27 PM GMT +05:30



Google

Saykheda, Maharashtra, India
227m+6j7, Saykheda, Maharashtra
422302, India
Lat 20.010706° Long 73.958672°
24/04/2025 02:07 PM GMT +05:30

DTC code - 2740819
DTC name - mhasoba
DP
Subdivision - ozar
Section - saikheda
Taluka - niphad
Dist - Nashik

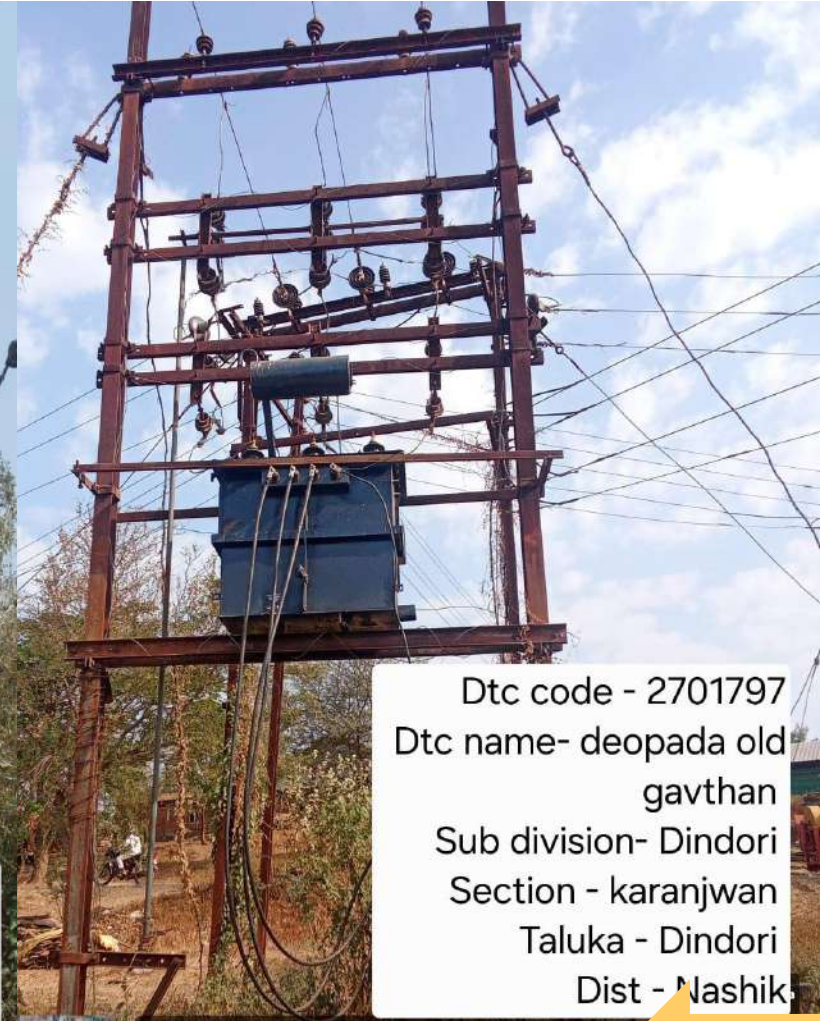

Dtc code - 2701797
Dtc name- deopada old
gavthan
Sub division- Dindori
Section - karanjwan
Taluka - Dindori
Dist - Nashik

Deopada, Maharashtra, India
Cp5h+3c4, Deopada, Maharashtra 422202, India
Lat 20.407132° Long 73.727903°
24/04/2025 08:46 AM GMT +05:30

BACK

महावितरण: प्रणाली व ग्राहक मीटरिंग (१/२)



महाराष्ट्र शासन

District	Feeder Meter		DT Meter		Consumer Meter	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
C.S.NAGAR	103	105	3,820	3,415	13,962	34,251
JALNA	65	67	1,638	812	4,220	11,882
BEED	69	71	2,536	471	5,348	10,631
LATUR	73	75	2,181	1,354	7,998	18,950
DHARSHIV	62	63	1,662	313	4,813	13,265
HINGOLI	38	39	1,155	637	3,068	9,313
NANDED	74	76	2,455	868	9,730	24,766
PARBHANI	40	41	1,436	1,253	4,126	8,325
RAIGAD	27	28	2,411	3,383	14,711	69,017
THANE	164	168	6,904	11,668	92,129	2,57,601
DHULE	54	55	1,439	806	6,793	10,957
JALGAON	116	120	3,443	4,204	14,583	33,379
NANDURBAR	35	36	1,036	497	3,638	6,518
PALGHAR	23	23	1,731	2,110	8,498	38,882
RATNAGIRI	26	26	2,404	2,261	12,274	45,714
SINDUDURG	16	16	1,239	1,641	6,904	24,167
A'NAGAR	162	167	5,927	3,944	13,590	37,075

[BACK](#)

महावितरण: प्रणाली व ग्राहक मीटरिंग (२/२)



महाराष्ट्र शासन

District	Feeder Meter		DT Meter		Consumer Meter	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
NASHIK	155	159	7,014	5,301	21,144	61,781
AKOLA	49	50	1,524	1,561	8,045	18,856
BULDHANA	69	71	1,788	1,494	9,799	22,389
WASHIM	31	32	1,061	1,328	4,015	9,765
AMARAVATI	76	79	2,038	4,991	13,301	34,697
YAVATMAL	56	58	2,161	1,422	10,483	14,280
CHANDRAPUR	39	40	1,272	1,154	8,868	26,879
GADCHIROLI	28	28	1,002	445	6,971	15,740
BHANDARA	27	28	857	1,158	6,299	22,080
GONDIA	23	24	974	1,129	6,151	33,070
NAGPUR	129	132	3,773	3,777	28,318	86,129
WARDHA	35	36	1,139	864	7,248	14,751
SATARA	70	72	3,331	4,110	16,952	57,382
SOLAPUR	160	165	4,638	4,716	15,316	79,012
KOLHAPUR	91	93	3,929	10,121	21,827	1,62,672
SANGLI	85	87	3,568	5,503	14,358	88,201
PUNE	243	250	11,151	16,793	77,767	1,85,002
MSEDCL TOTAL	2,512	2,582	94,638	1,05,505	5,03,248	15,87,380

BACK

महावितरण : वाहिनी मीटरिंग



महाराष्ट्र शासन



XR99+C53, Gandhi Nagar Airport Area, Deolali Gaon, Nashik, Maharashtra 422501, India

Latitude 19.9683202 N Longitude 73.8180128 E
Local 12:41:20 PM Altitude 591 meters
GMT 07:11:20 AM Thursday, 01.05.2025

Note : Div - Nashik U-II, Sub div - Nashik Road
Substation - 33/11 KV Upnagar
Feeder - 33 KV I/C Main
CTR - 400/1 A, PTR - 33 KV/110 V



XR99+C53, Gandhi Nagar Airport Area, Deolali Gaon, Nashik, Maharashtra 422501, India

Latitude	Local	01:26:38 PM
19.96837151°	GMT	07:56:38 AM
Longitude	Altitude	590 meters
73.81801856°	Date	Sat, 23 Nov 2024

Note : S/D :- Nashik Road
Sec :- Upnagar
S/S :- 33/11 KV Upnagar
FDR :- 33 KV OG Garrison exp



XR99+C53, Gandhi Nagar Airport Area, Deolali Gaon, Nashik, Maharashtra 422501, India

Latitude 19.9683219 N Longitude 73.8180128 E
Local 12:41:29 PM Altitude 591 meters
GMT 07:11:29 AM Thursday, 01.05.2025

Note : Div - Nashik U-II, Sub div - Nashik Road
Substation - 33/11 KV Upnagar
Feeder - 33 KV I/C Main
CTR - 400/1 A, PTR - 33 KV/110 V

BACK

महावितरण : ग्राहक मीटरिंग



महाराष्ट्र शासन



महावितरण : वितरण रोहित्र मीटरींग



महाराष्ट्र शासन



BACK


महावितरण : वीज पुरवठा तास (शहरी / ग्रामीण)



महाराष्ट्र शासन



वीज पुरवठा तास

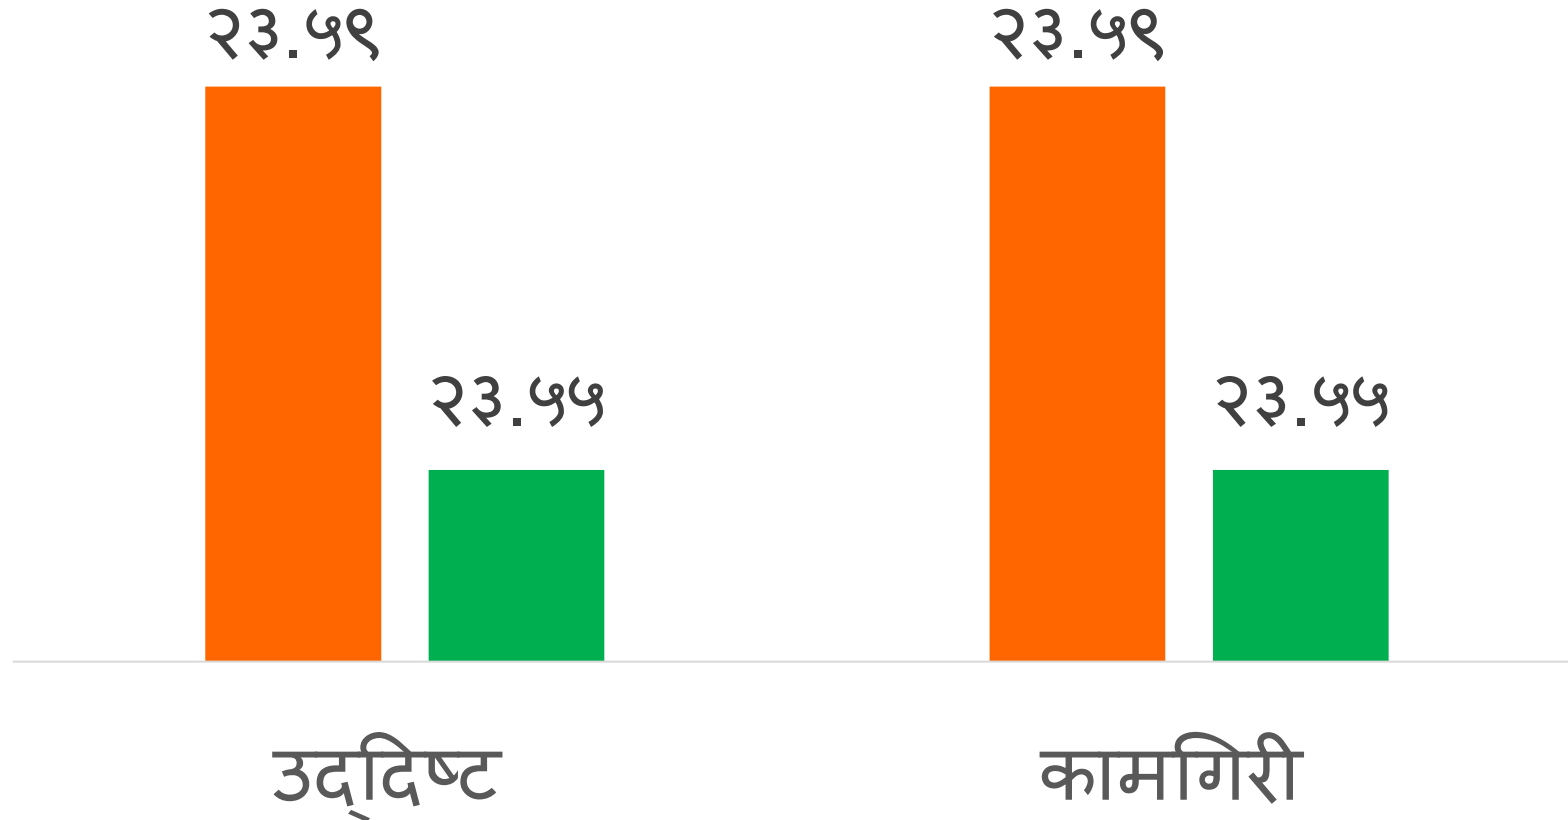

BACK


महावितरण : वीज बिलिंग संबंधित तक्रारी



महाराष्ट्र शासन



वीज बिलिंग संबंधित तक्रारी
(४,३५,९४८)

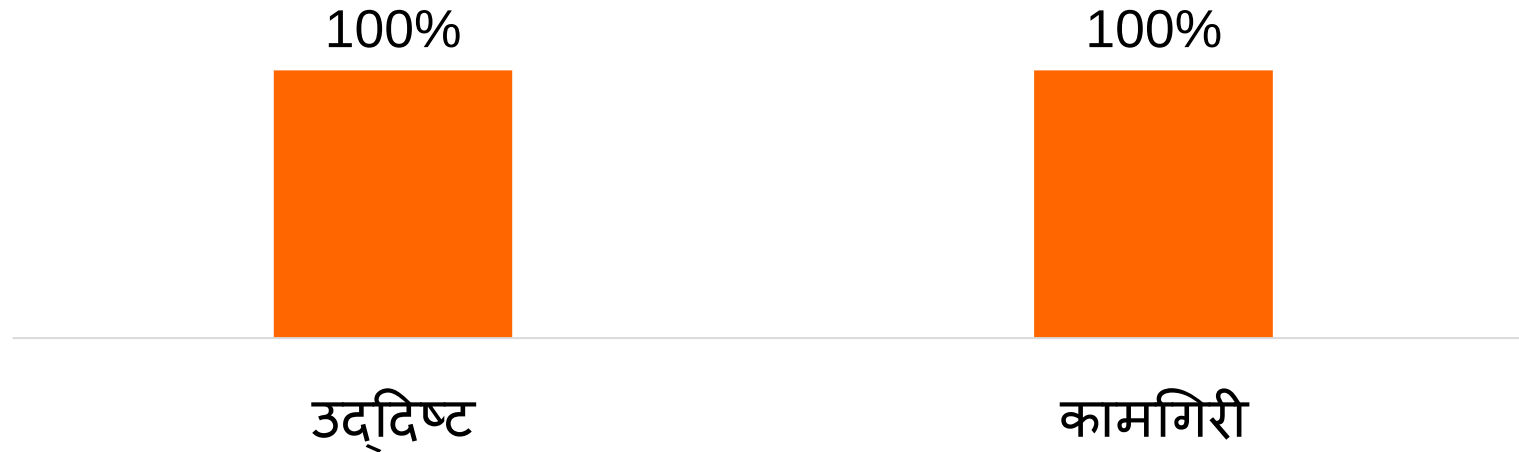

BACK


महावितरण : वीज पुरवठा संबंधित तक्रारी



महाराष्ट्र शासन



वीज पुरवठा संबंधित तक्रारी
(३,९३,२०१)

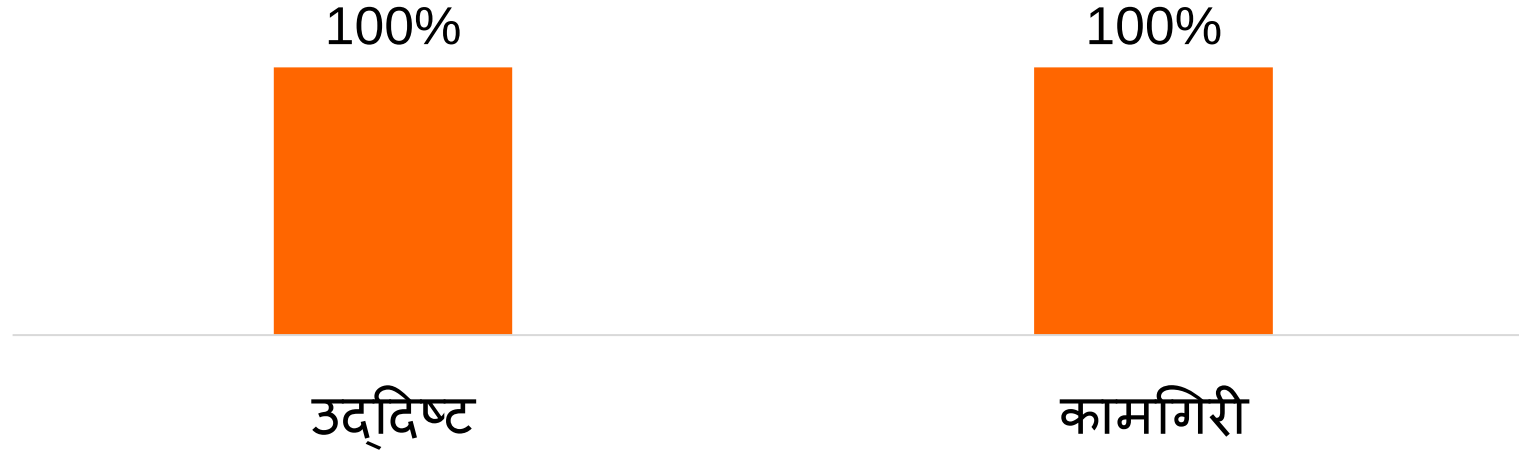

BACK


महावितरण : निर्दिष्ट वेळेत नवीन आलेल्या वीज जोडण्या



महाराष्ट्र शासन



नवीन वीज जोडण्या

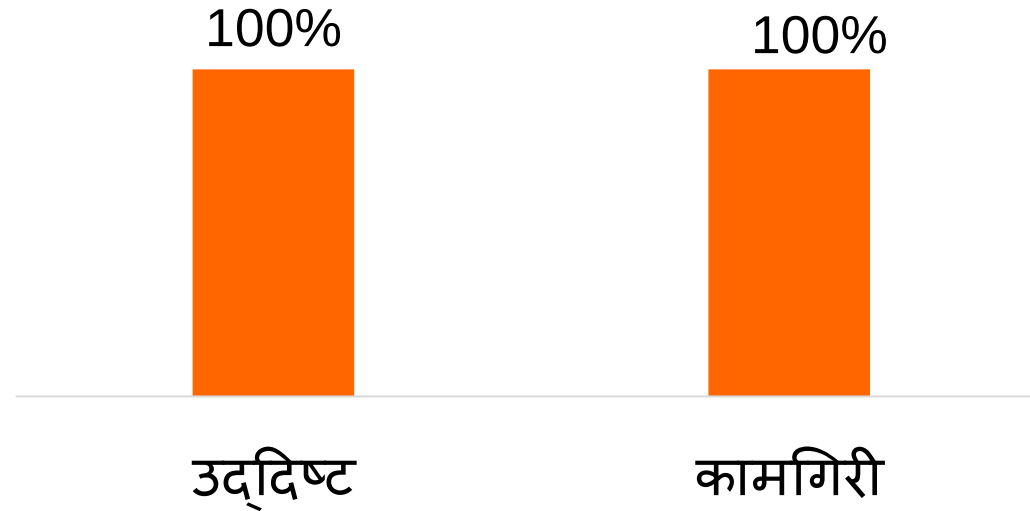

BACK

महावितरण : प्रधानमंत्री - सूर्य घर मोफत वीज योजना



महाराष्ट्र शासन

SN	District	Total Installation (Nos)	TOTAL RE Capacity (MW)
1	AHILYANAGAR	3319	11.14
2	AKOLA	3170	11.97
3	AMARAVATI	5981	25.67
4	BEED	1378	5.05
5	BHANDARA	1850	6.76
6	BULDHANA	3405	11.88
7	CHANDRAPUR	3189	12.08
8	CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR	6621	23.04
9	DHARASHIV	893	3.25
10	DHULE	3823	13.88
11	GADCHIROLI	372	1.49
12	GONDIA	1224	4.62
13	HINGOLI	677	2.51
14	JALGAON	8489	31.37
15	JALNA	1789	6.34
16	KOLHAPUR	4966	17.29
17	LATUR	2596	9.95
18	NAGPUR	16476	63.82


SN	District	Total Installation (Nos)	TOTAL RE Capacity (MW)
19	NANDED	1826	7.87
20	NANDURBAR	1596	5.71
21	NASHIK	6053	21.34
22	PALGHAR	800	3.24
23	PARBHANI	1677	6
24	PUNE	7818	33.75
25	RAIGAD	1529	6.2
26	RATNAGIRI	402	1.35
27	SANGLI	2904	9.94
28	SATARA	1939	6.17
29	SINDUDURG	282	0.95
30	SOLAPUR	3766	12.68
31	THANE	216	2.51
32	WARDHA	3310	11.31
33	WASHIM	1456	5.13
34	YAVATMAL	2526	9.59
35	Grand Total	108318	405.85

BACK

महावितरण : प्रधानमंत्री - सूर्य घर मोफत वीज योजना



महाराष्ट्र शासन

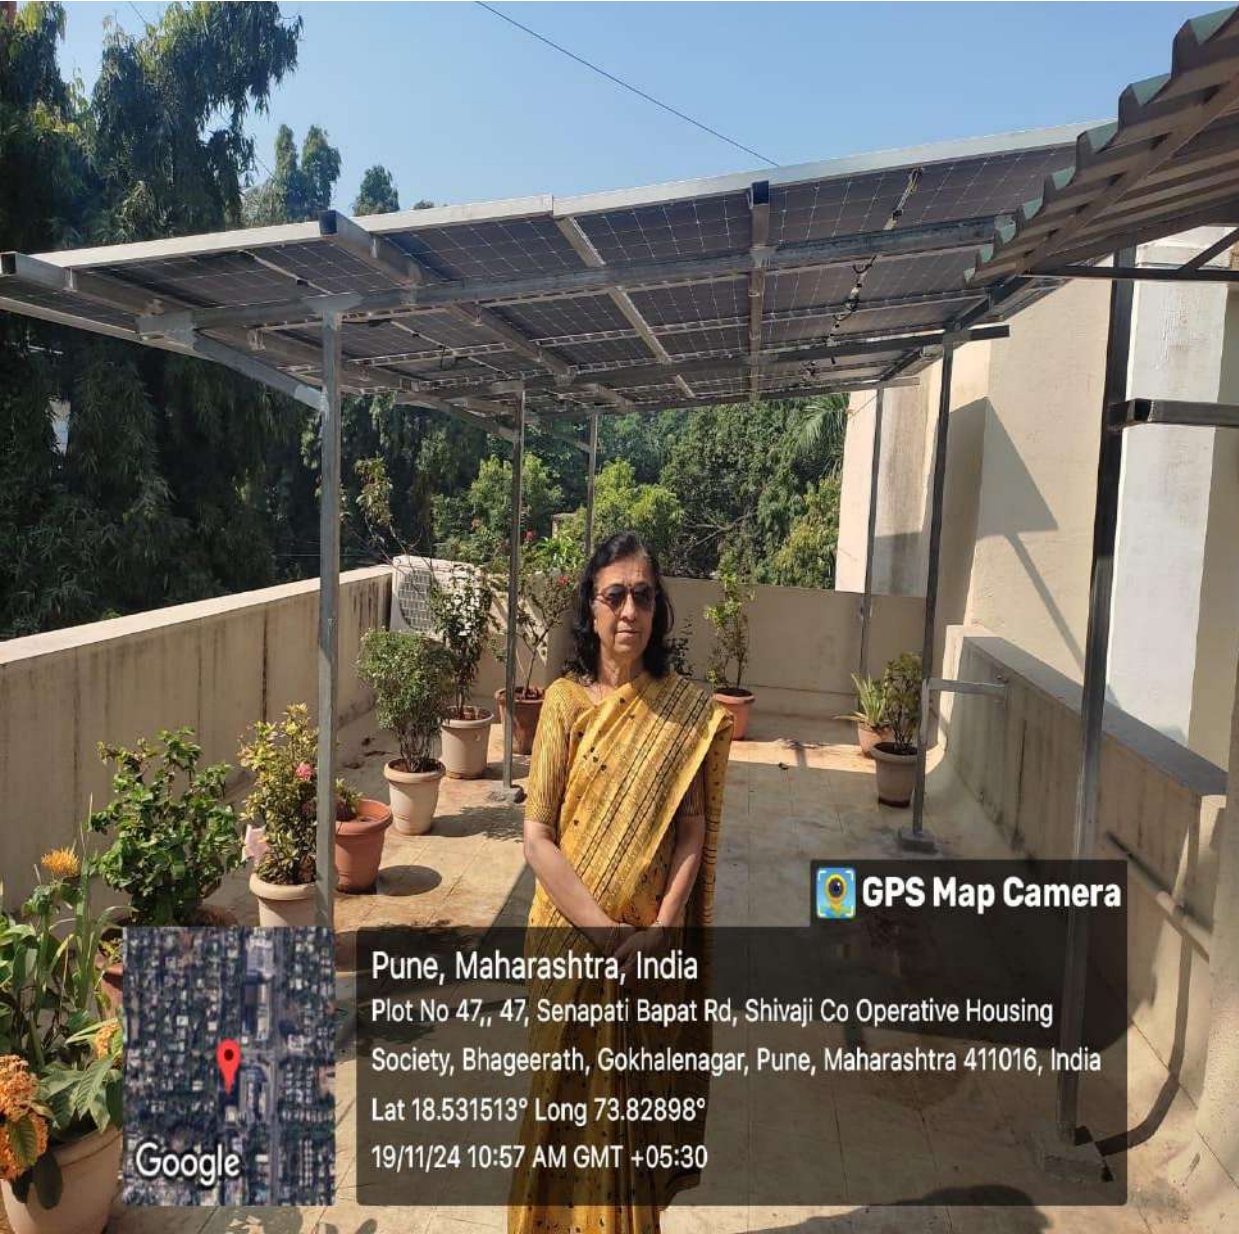

GPS Map Camera

Pune, Maharashtra, India

Plot No 47,, 47, Senapati Bapat Rd, Shivaji Co Operative Housing
Society, Bhageerath, Gokhale Nagar, Pune, Maharashtra 411016, India

Lat 18.531513° Long 73.82898°

19/11/24 10:57 AM GMT +05:30

Google



BACK

महावितरण : पी-एम कुसुम घटक -ब योजना - मागेल त्याला सौर पंप योजना



महाराष्ट्र शासन

District Name	KUSUM B	MTSKPY	Grand Total
Ahilyanagar	16864	3493	20357
Akola	1212	12	1224
Amravati	465	17	482
Beed	7816	1276	9092
Bhandara	1739	78	1817
Buldhana	3939	986	4925
Chandrapur	222	31	253
Ch. Sambhajinagar	8141	1422	9563
Dharashiv	5410	1154	6564
Dhule	3531	809	4340
Gadchiroli	1015	47	1062
Gondia	1310	62	1372
Hingoli	5538	1154	6692
Jalgaon	7843	843	8686
Jalna	5830	1702	7532
Kolhapur	1005	71	1076
Latur	4117	1308	5425

District Name	KUSUM B	MTSKPY	Grand Total
Nagpur	151	14	165
Nanded	5237	187	5424
Nandurbar	3023	115	3138
Nashik	12045	3465	15510
Palghar	274	1	275
Parbhani	4915	2856	7771
Pune	5016	265	5281
Raigad	33	2	35
Ratnagiri	74	1	75
Sangli	1954	43	1997
Satara	3194	32	3226
Sindhudurg	38		38
Solapur	8300	974	9274
Thane	100	1	101
Wardha	135	4	139
Washim	3319	148	3467
Yavatmal	2397	154	2551
Grand Total	126202	22727	148929

BACK

महावितरण : पी-एम कुसुम घटक -ब योजना - मागेल त्याला सौर पंप योजना



महाराष्ट्र शासन



Latitude: 19.225635
Longitude: 77.202305
Elevation: 375.85±10 m
Accuracy: 6.2 m
Time: 12-26-2024 15:44
Note: Narayan lakshman suryawanshi
At.post.talni
TQ.nanded dist.nanded



Latitude: 19.215418
Longitude: 76.834404
Elevation: 395.48±10 m
Accuracy: 6.6 m
Time: 18-01-2025 11:58
Note: . MS130322134

BACK

Power

महावितरण : पी-एम कुसुम घटक -ब योजना - मागेल त्याला सौर पंप योजना



महाराष्ट्र शासन



BACK

Powered

महावितरण : सौर ग्राम योजना (गावांचे १००% सौर ऊर्जीकरण)

अ. क्र.	जिल्हा	तालुका	गावांचे नाव	LATITUDE	LONGITUDE
१	वर्धा	हिंगणघाट	चिंचघाट	20.574342	78.884126
२	रायगड	पेण	कुरमुर्ली	18.721968	73.169462
३	कोल्हापूर	करवीर	शेळकेवाडी	16.630658	74.158221
४	वर्धा	आर्वी	नेरी	20.985403	78.233470
५	रायगड	खालापूर	राणसाई	18.895514	73.084300
६	ठाणे	शाहपूर	बेंडेकोण	19.604436	73.369430
७	नागपूर	देवलापूर	खापा	21.598140	79.302970
८	सोलापूर	दक्षिण सोलापूर	हिपाळे	17.552614	76.007184
९	अमरावती	चांदूर बाजार	नगरवाडी	21.360749	77.784469
१०	चंद्रपूर	सावली	सदागड हेटी	20.094402	79.756534
११	वर्धा	देवळी	रायपूर	20.548032	78.482970
१२	छत्रपती संभाजी नगर	फुलंब्री	पोफला	20.035157	75.465910

BACK

चिंचघाट



कुरमुर्ली




शेळकेवाडी



नेरी



राणसाई

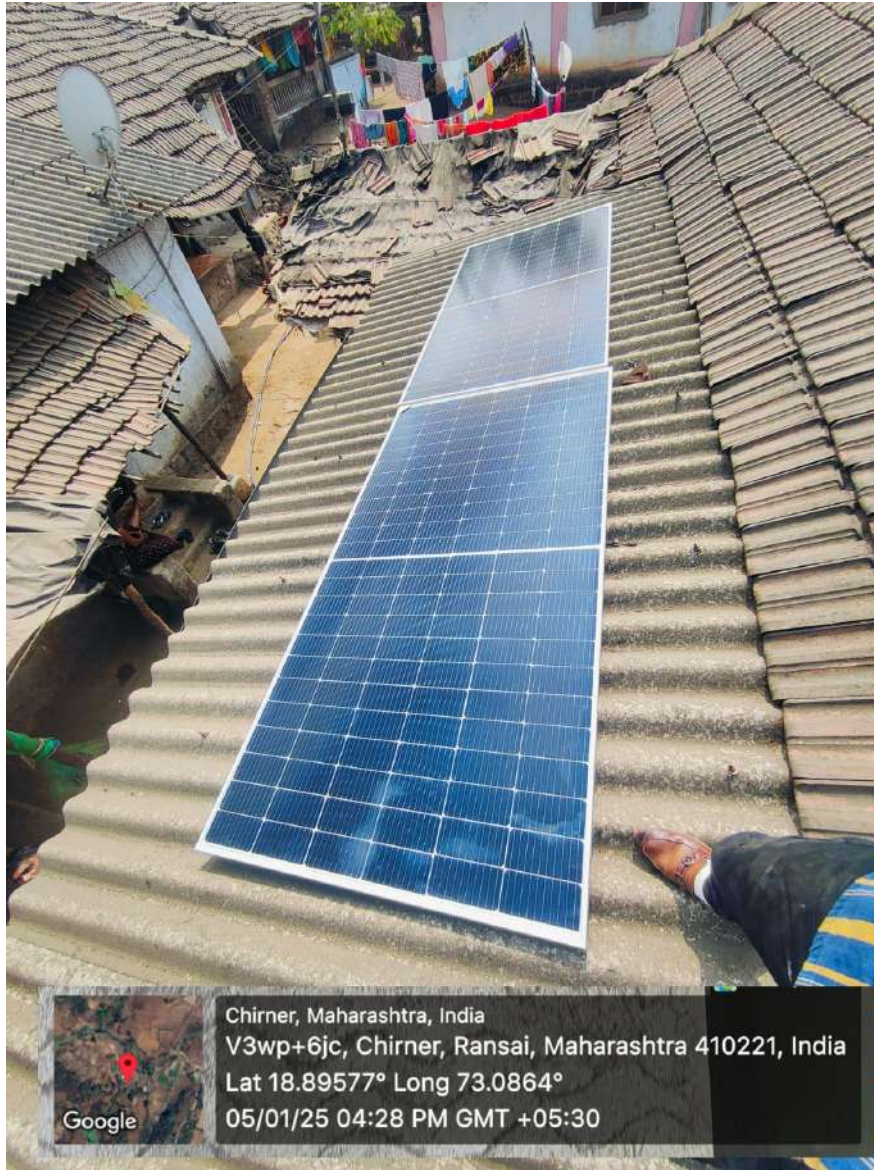

बेंडेकोण




खापा

Lat:21.59814, Lng:79.30297
H8X3+868 Ma sharda niwas,
Khapa, Maharashtra 441401, India




हिपाळे

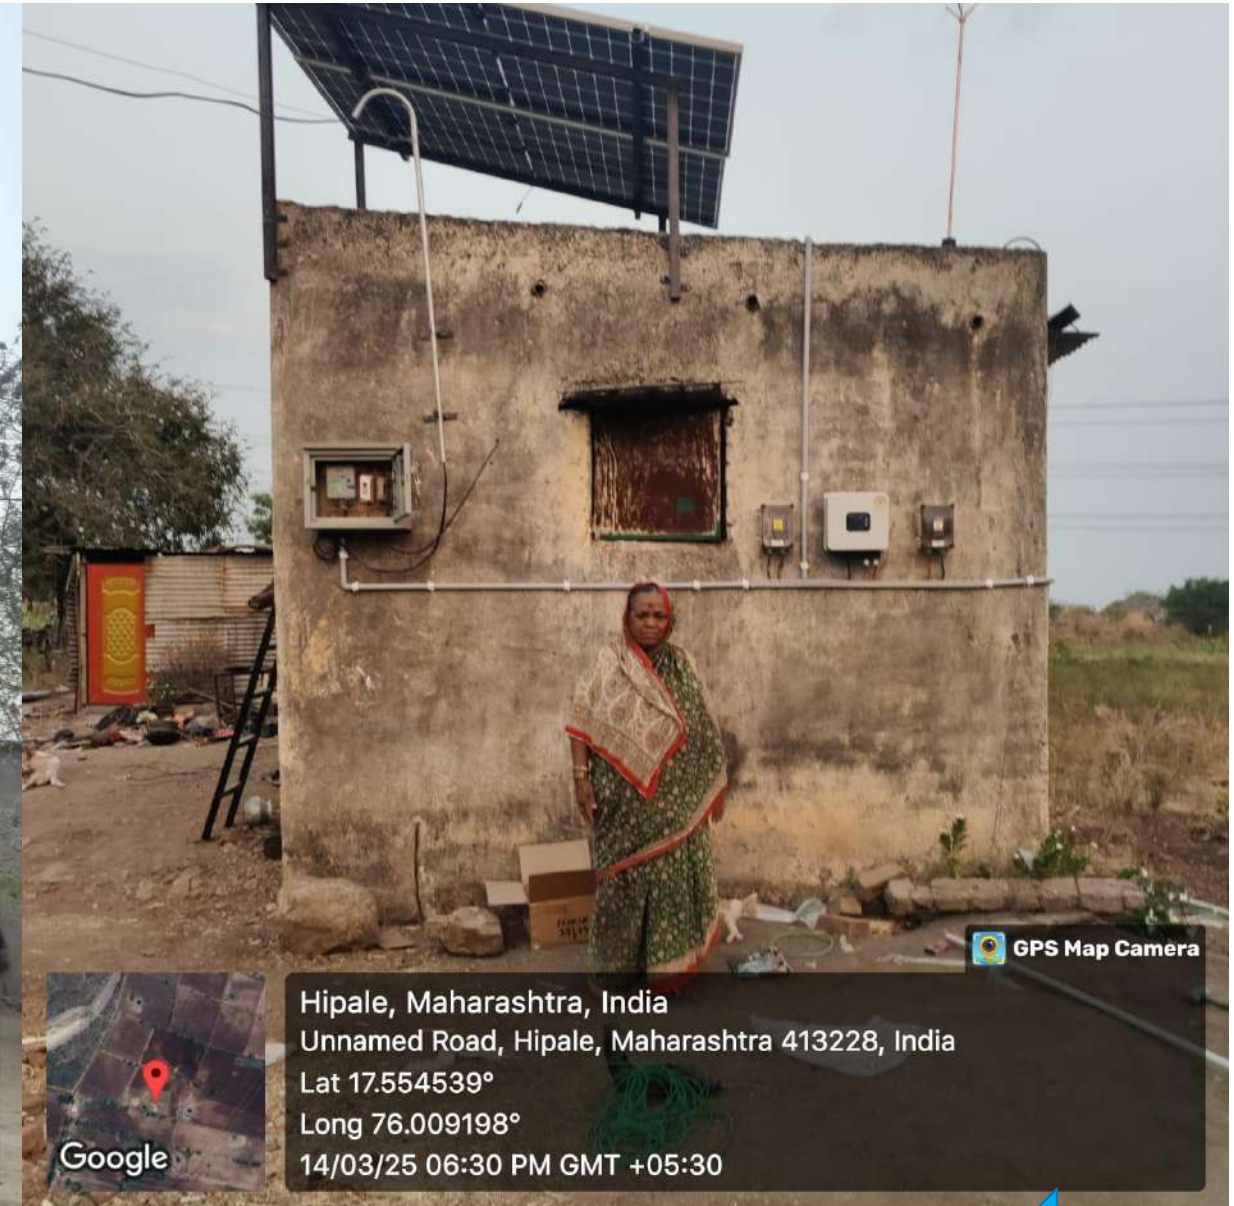

Back

नगरवाडी

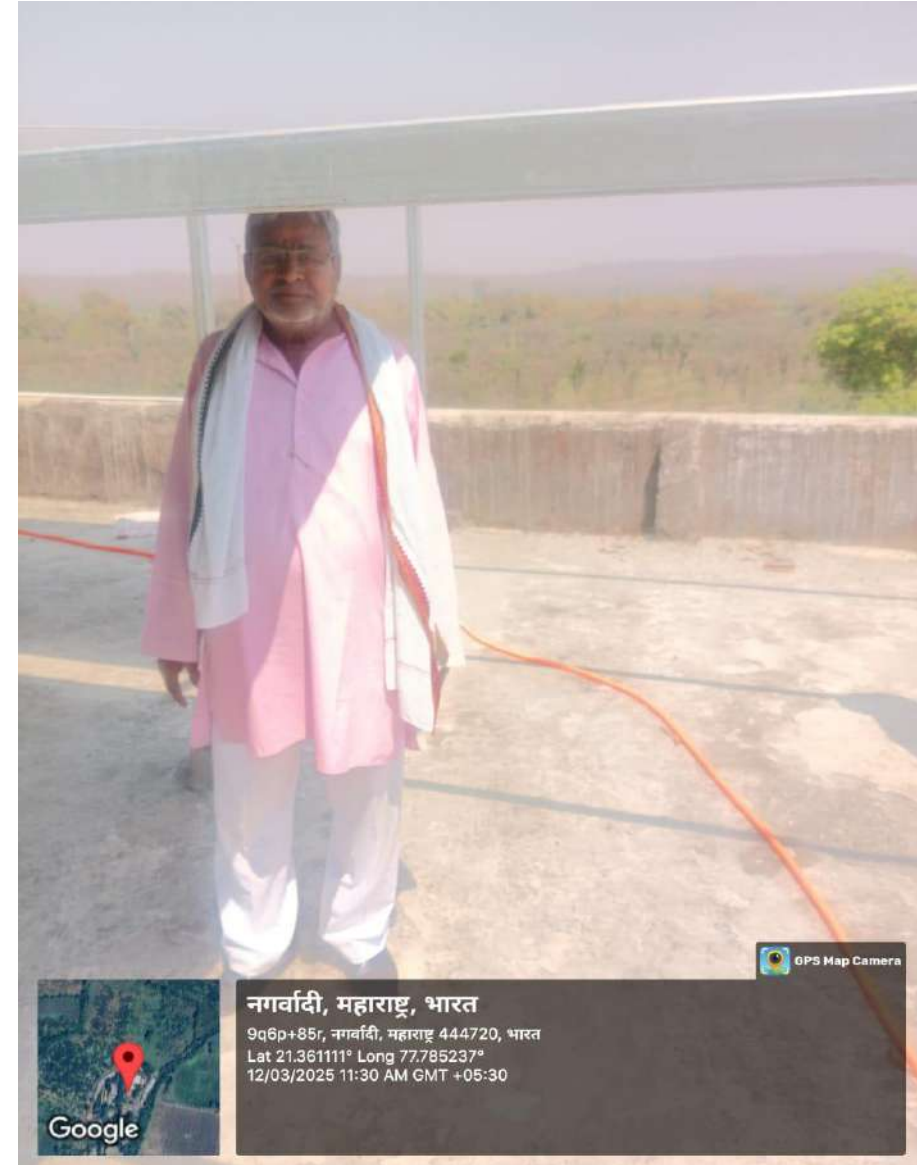

सदागड हेटी



रायपूर



पोफला



Back

महावितरण : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	MSEDCL Circle	Substation Description	Solar Capacity Installed (MW)
1	AKOLA	AKOLA	JALALABAD Ss 33 kV	3
2	AKOLA	AKOLA	CHANNI 33/11 KV	3
	AKOLA	AKOLA	CHANNI 33/11 KV	5
3	AKOLA	AKOLA	MANA 33/11 KV	2
4	AKOLA	Akola	UKALI BZ	4
5	AKOLA	Akola	BARSHI TAKALI	2
6	AKOLA	Akola	Sawara	2
7	AKOLA	Akola	WADEGAON	5
8	AKOLA	AKOLA	Gaigao	4
9	AKOLA	AKOLA	Sawara	3
10	AHILYANAGAR	AHILYANAGAR	Rashin, Kuldharan, Kolgaon, Kombhali	50.0
11	BEED	BEED	BARDAPUR 33/11 KV	3
12	BEED	BEED	RAJAPUR SURDI 33/11 KV	3
13	BEED	BEED	Khalapuri	3
14	BEED	BEED	33/11 KV DAULAWADGAON	5
15	BEED	BEED	33/11 KV MIRGAON S/Stn	2
16	BEED	BEED	ASTHANARAYAN	4
17	BEED	BEED	DHAMANGAON	5
18	BEED	BEED	Belora	3
19	BEED	BEED	Pendgaon	2.5
20	BEED	BEED	KEKAT PANGARI	1
21	BEED	BEED	PATTIWADGAON	4
22	BEED	BEED	Dhanora	7
23	BEED	BEED	POKHARI	4
24	BULDHANA	BULDHANA	Palshi Ss 33/11 kV	5
25	BULDHANA	BULDHANA	UKALI 33/11 kV	7
26	BULDHANA	Buldhana	PETH(DHOTRA BHANGOJI)	3
27	BULDHANA	Buldhana	KOTHALI	5
28	BULDHANA	Buldhana	Chandol	5
29	CH. SAMBHAJI NAGAR	CH. SAMBHAJI NAGAR	DHONDALGAON Ss 33/11 kV	3
30	CH. SAMBHAJI NAGAR	CH. SAMBHAJI NAGAR	ALAND 33 KV	6

BACK

महावितरण : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	MSEDCL Circle	Substation Description	Solar Capacity Installed (MW)
31	CH. SAMBHAJI NAGAR	CH. SAMBHAJI NAGAR	33 KV ANWI	5
32	CH. SAMBHAJI NAGAR	Ch.Sambhaji Nagar	JODWADI	4
33	CH. SAMBHAJI NAGAR	Ch.Sambhaji Nagar	BHAIGAON GANGA	4
34	CH. SAMBHAJI NAGAR	Ch.Sambhaji Nagar	MANGRUL	4
35	CH. SAMBHAJI NAGAR	Ch.Sambhaji Nagar	Vihamandava	3
36	CH. SAMBHAJI NAGAR	CH. SAMBHAJI NAGAR	LONI	10
37	DHARASHIV	OSMANBAD	SHAHAPUR 33/11 KV	4
38	Dharashiv	DHARASHIV	NARANGWADI 33/11 KV	2
39	Dharashiv	Dharashiv	Dhoki	7
40	Dharashiv	Dharashiv	TAWSHIGAD	4
41	DHARASHIV	DHARASHIV	Baloor	7
42	JALGAON	JALGAON	WAWADE 33/11 kv	4
43	JALGAON	JALGAON	LASGAON 33/11 KV	5
44	JALGAON	JALGAON	VELHALE 33/11 kv	8
45	JALGAON	Jalgaon	Sanghavi 33/11 KV	4
46	JALGAON	Jalgaon	33/11 KV KURHE	5
47	JALGAON	Jalgaon	SAVAKHEDE HOL	9
48	JALGAON	Jalgaon	Chandsar	4
49	JALGAON	Jalgaon	MAHALPUR	6
50	JALGAON	JALGAON	VASANTWADI WAWADADA	3
51	JALGAON	JALGAON	Golegao	4
52	Jalna	JALNA	Ner 33/11 kv	6
53	Jalna	JALNA	KELIGAVAN 33/11 KV (7875166797)	5
54	Jalna	Jalna	KHANDAVI	5
55	JALNA	JALNA	Nalni (Kaperkheda)	5
56	JALNA	JALNA	Chandanpuri	4
57	Jalna	Jalna	WALSA DAWARGAON	4
58	KOLHAPUR	KOLHAPUR	Kondigre Ss 33/11kv	3
59	Kolhapur	KOLHAPUR	K.WATHAR 110/33/11 KV	2
60	KOLHAPUR	Kolhapur	SATAVE 33/11 KV	4

BACK

महावितरण : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	MSEDCL Circle	Substation Description	Solar Capacity Installed (MW)
61	Kolhapur	KOLHAPUR	33/11 KV HATKANGALE	4
62	Kolhapur	KOLHAPUR	MAHAGAON	3
63	Latur	LATUR	RENAPUR 33/11 KV	7
64	Latur	Latur	MAMDAPUR 33/11 KV	2
65	Latur	Latur	Mangrool 33/11 KV	5
66	LATUR	Latur	TALNI 33/11 KV	3
67	LATUR	Latur	LAMJANA 33/11 KV	2
68	LATUR	LATUR	BHATANGALI 33/11 KV	1
69	LATUR	LATUR	SHIVANKHED 33/11 KV	5
70	LATUR	LATUR	BITTERGAON 33/11 KV	6
71	LATUR	LATUR	KUMTHA 33/11 KV	5
72	LATUR	LATUR	ZARI 33/11 KV	2
73	LATUR	LATUR	Kharosa	2
74	LATUR	LATUR	Jawalga	5
75	LATUR	LATUR	Tapse Chincholi	5
76	LATUR	LATUR	Umapur	2
77	LATUR	LATUR	OMARGA	3
78	LATUR	LATUR	NANDURGHAT	3
79	LATUR	LATUR	WADWAL	5
80	LATUR	LATUR	Bopla	5
81	LATUR	LATUR	Halli	8
82	LATUR	LATUR	Devangara	5
83	LATUR	LATUR	Nagarsoga	5
84	LATUR	LATUR	Panchincholi	2
85	LATUR	LATUR	Madansuri	5
86	LATUR	LATUR	Ramegaon	4
87	Latur	LATUR	Kharosa	2.5
88	Latur	LATUR	Karala	3
89	Latur	LATUR	Gadwad	3
90	Latur	LATUR	Chapoli	2.5

BACK

महावितरण : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	MSEDCL Circle	Substation Description	Solar Capacity Installed (MW)
91	Latur	LATUR	Lasona	2
92	Latur	LATUR	Lohara	2.5
93	Latur	LATUR	WALANDI	8
94	Latur	LATUR	AHMEDPUR	2
95	Latur	LATUR	NAGRAL	4
96	Latur	LATUR	NANAND	6
97	Latur	LATUR	PALSI	8
98	Latur	LATUR	BELKUND	10
99	Latur	LATUR	Togri	5
100	Latur	LATUR	Yerol	2.5
101	Latur	LATUR	Shirur Tajban	8
102	NANDED	NANDED	BAMNI Ss 33 kV	5
103	Nanded	NANDED	KAPSI 33/11 KV	8
104	Nanded	Nanded	JAMB 33/11 kV	3
105	NANDED	Nanded	UMARI 33/11 KV	10
106	Nanded	Nanded	PHULWAL	4
107	Nanded	Nanded	Khanapur MIDC	3
108	Nanded	Nanded	Moghali	5
109	Nanded	Nanded	Bhatangali	2.5
110	Nanded	Nanded		5
111	Nanded	Nanded	Pethwadaj	5
112	NASHIK	MALEGAON	KARANJAD 33/11 KV (AE-Pawar Devendra-9029122662)	4
113	NASHIK	MALEGAON	SAVKARWADI 33/11 KV	3
114	NASHIK	NASHIK	SAMANGAON 33/11 KV	5
115	Nashik	Nashik	DEOPUR 33/11 KV	5
116	NASHIK	NASHIK	SHIRUR TANGADI 33/11 kv	5
117	NASHIK	Nashik	WADZIRE 33/11 KV	4
118	NASIK	NASIK	WAVI	4
119	NASHIK	NASIK	WADANGALI	5

BACK

महावितरण : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	District	MSEDCL Circle	Substation Description	Solar Capacity Installed (MW)
120	Nashik	NASHIK	MUNGSARA 33/11 kV	2.2
				1.8
121	Nashik	Nashik	NAIGAON	10
	Nashik	Nashik	NAIGAON	5
122	Nashik	Nashik	chikhalambe	10
123	Nashik	Malegaon	33/11 KV VADNER	10
124	NASHIK	Malegaon	NANDGAON	7
125	Parbhani	Parbhani	Dudhgaon	4
126	Parbhani	Parbhani	Charthana	5
127	Pune	BARAMATI	MURUM 33/11 KV (7875812814)	3
128	SANGLI	SANGLI	BASARGI 33/11 KV	4
129	SANGLI	Sangli	33/11KV Borgaon	9
130	SANGLI	Sangli	Madgule	5
131	SANGLI	SANGLI	JIRGYAL	4
132	SANGLI	SANGLI	LINGIVARE	5
133	SATARA	SATARA	BIJAWADI 33/11 KV	5
134	SATARA	SATARA	DHONDEWADI 33/11 KV	3
	SATARA			2
135	SATARA	Satara	VIKHALE	8
136	SATARA	Satara	Bhosare	3
137	SATARA	SATARA	Katar Khatav	5
138	Solapur	SOLAPUR	Sade	2
139	Solapur	Solapur	Pangari	2
140	WASHIM	WASHIM	SHELU BAZAR 33/11 KV	4
141	Washim	WASHIM	UMBARDA BAZAR 33/11 KV	4
142	Washim	WASHIM	Pethkhadanpur 33/11 kV	2
143	Washim	Washim	DHANAJ 33/11 KV	2
144	WASHIM	Washim	WAKAD	2
145	Washim	Washim	Dhanora	5
146	Yavatmal	Yavatmal	Sawargao-Parsodi	3
147	Yavatmal	Yavatmal	Sakhara	4
148	Yavatmal	Yavatmal	Bitargaon	5
Total Capacity (MW)				721

BACK

Several Projects commissioned in record time

MSKVY- 2.0



Capacity: - 3 MW
Pangra, Tq- Patur, Dist : Akola



Capacity: - 4 MW
Dhondalgaon ,Tq- Vaijapur , Dist : Ch. Sambhajinagar



Capacity: - 7 MW
Renapur ,Tq- Renapur, Dist : Latur



Capacity: - 5 MW
Bamni ,Tq- Biloli, Dist : Nanded



Capacity: - 6 MW
Warkhedi ,Tq- Phulambri, Dist : Ch. Sambhajinagar



Capacity: - 8 MW
Umra, Tq- Loha, Dist : Nanded



Capacity: - 4 MW
Hissai, Tq- Mangrulpir, Dist : Washim



Capacity: - 4 MW
Umbarda Bazar, Tq- Karanja, Dist : Washim



Capacity: - 5 MW
Palshi Bk, Tq- Khamgaon, Dist : Buldhana




Capacity: - 3 MW
Bardapur ,Tq- Ambejogai, Dist : Beed



Capacity: - 4 MW
Shahapur ,Tq- Tulajapur, Dist : Dharashiv



Capacity: - 3 MW
Jalalabad, Tq- Barshitakali, Dist : Akola

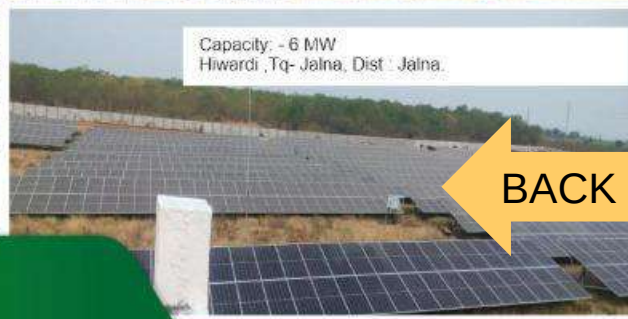

Capacity: - 6 MW
Hiwardi ,Tq- Jalna, Dist : Jalna

Vidharbha & Marathwada Region

BACK

Several Projects commissioned in record time

MSKVY- 2.0



Capacity: - 3 MW
Murum, Tq- Baramati, Dist : Pune



Capacity: - 4 MW
Basaragi ,Tq- Jat, Dist : Sangli



Capacity: - 5 MW
Lasgaon, Tq- Pachora, Dist : Jalgaon



Capacity: - 3 MW
Haroli ,Tq- Shirol, Dist : Kolhapur




Capacity: - 5 MW
Samangaon, Tq : , Dist : Nashik



Capacity: - 4 MW
Kini, Tq- Hatkanangle, Dist : Kolhapur




Capacity: - 4 MW
Wawade ,Tq- Amalner, Dist : Jalgaon




Capacity: - 4 MW
Mungsare , Tq. Dist : Nashik



Capacity: - 5 MW
Bijawadi ,Tq- Mann, Dist : Satara

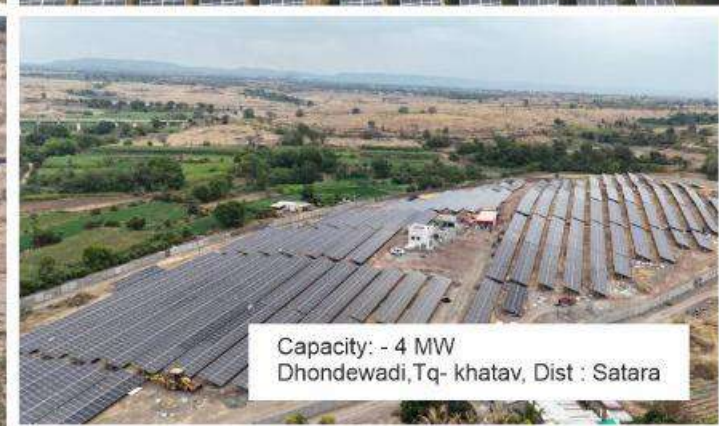

Capacity: - 4 MW
Dhondewadi, Tq- khatav, Dist : Satara

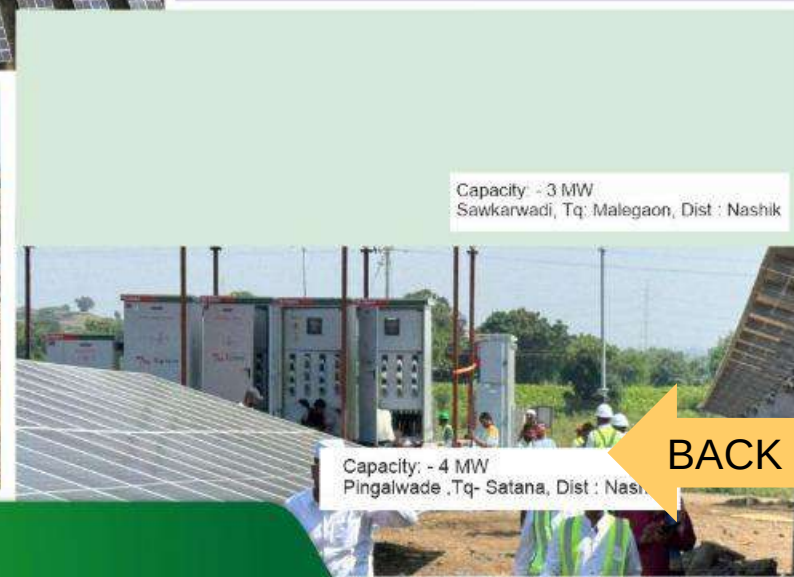

Capacity: - 3 MW
Sawkarwadi, Tq: Malegaon, Dist : Nashik

Capacity: - 4 MW
Pingalwade ,Tq- Satana, Dist : Nasik

BACK

Pune & Kokan Region



महानिर्मिती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित

महानिर्मिती : क्रिटिकल औष्णिक विद्युत संचाची उभारणी.



महाराष्ट्र शासन



MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION CO. LTD.

Office of Chief Engineer (Projects & Planning),

'Prakashgad', 3rd floor, Bandra (East), Mumbai-400 051

Phone: (C) 022-69852200 / 022-69853535 (Extn.3520) Email-cgmpp@mahagenco.in

Ref. No. CE(P&P)/KRD 2x660 MW/U-11&12/BTG /SUPPLY/ 0125 Date: 7 FEB 2025

LETTER OF AWARD

For Supply of Equipment, Spares & Materials etc.

By Post/Email

To

M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd.,

BHEL House,

Siri Fort,

NEW DELHI - 110 049

Email: jgulati@bhel.in, scv@bhel.in, ajaya@bhel.in

Subject: Design, Engineering, Manufacture, Inspection, Testing at Manufacturer's work, supply, Forwarding to Site, Civil, Structural & Architectural Works, Marine-cum-Erection insurance, Transportation, Delivery, Unloading, Receipt at Site, Storage at Site, Erection, Testing and Commissioning of Main Plant (BTG Package) comprising of Steam Generator, Steam Turbine & Generator complete with all auxiliaries, accessories including FGD, SCR and Supply of mandatory spares, special tools & tackles for Koradi Thermal Power Station 2x660 MW Units - 11 & 12 Project on Engineering Procurement & Construction (EPC) Basis - Supply of Main Plant (BTG Package) Equipment, Spares & Materials etc.- reg.

Reference:

1. IFB No. RFx No 3000046202 issued on 01.03.2024 & final extension issued for bid submission in SRM system, till 22.07.2024.
2. Pre-bid meeting conducted on date 09.05.2024 & 10.05.2024.
3. Amendment 1 to 9 and addendum 1 to 6 along with replies to pre-bid queries issued in SRM system on 21.06.2024.
4. Corrigendum -1 along with replies on additional pre-bid queries issued for Bid Specification issued in SRM system, on 04.07.2024.
5. Amendment No. 10 & 11 along with replies on additional pre-bid queries issued in SRM system on 18.07.2024.
6. M/s BHEL's offer no. MS-1-23-E-0012 dtd. 20.07.2024 & opened on 26.07.2024 (Techno-commercial bid).
7. M/s BHEL's Online Price bid proposal (opened on 05.08.2024).
8. Post bid meetings carried out on 22.08.2024, 25.09.2024 & 03.10.2024.
9. Minutes of Meeting dtd. 10.01.2025 between MSPGCL & M/s BHEL.
10. CE (P&P)'s email dtd. 14.01.2025.
11. M/s BHEL's revised offer no. MS-1-23-E0012 dtd. 16.01.2025.

20

BACK

महानिर्मिती : ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प



महाराष्ट्र शासन



BACK



महापारेषण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

महापारिषण – किमान ३ महत्वाच्या ठिकाणी (सबस्टेशन) STATCOM च्या स्थापनेसाठी निवड करून तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे



महाराष्ट्र शासन

- A) STU vide O.N. dtd. 02/04/2025 has recommended to install the STATCOM at following locations:
- 1) 400 kV Dhule Substation - ± 200 MVar, 400kV STATCOM (to be implemented under InSTS)
 - 2) 400 kV Lonikand-II Substation - ± 300 MVar, 400kV STATCOM (to be implemented under InSTS)
 - 3) 765/400 kV Mahape Substation - ± 400 MVar, 400kV STATCOM (to be implemented Under TBCB - **RFP is published by BPC from 04/03/2025**)
- B) For the Sr. No. 1 & 2, the DPR has already been approved by the Board of Director as follows & copy of same are enclosed:
- 1) **400 kV Dhule Substation (Latitude - 20.9327, Longitude - 74.8122)** - 400 kV STATCOM, ± 200 MVar, 1x125 MVar MSC - BR No. 172/20 dtd. 04/04/2025, Estimated Cost - Rs. 443.21 Cr.
 - 2) **400 kV Lonikand-II Substation (Latitude - 18.6395, Longitude - 74.0402)** - 400 kV STATCOM, ± 300 MVar, 2x125 MVar MSC + 1x125 MVar MSR - BR No. 172/33 dtd. 04/04/2025, Estimated Cost - Rs. 439.11 Cr.
- C) Accordingly, DPR for STATCOMs at 03 locations have been approved.

[BACK](#)

महापारेषण - अस्तित्वात असलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांचे हाय परफॉर्मन्स कंडक्टरने क्षमता वृद्धिकरण करणे. रु . १५४९.२७ कोटी किमतीच्या १०२२.०२ सर्किट कि.मी.च्या नवीन योजना तयार करणे



महाराष्ट्र शासन

High Performance Conductor (HPC)

Part-A- 148 Ckm LoA Issued

Sr.No.	Name of Zone	Name of line	Line length in Ckm	Admin Approval No.	Cost in Crore	LOI/LOA No. & Date
1	Nashik	220kV Dhule-Malegoan line	80.5	BR No. 170/26 dt. 17.01.2025	58.78	437 dt. 21.02.2025
2	Pune	220 kV Chinchwad-2-Chakan Line and 220 kV Bhosari 1-Chakan Line	41.5	BR No. 170/27 dt. 17.01.2025	41.3	661 dt. 01.04.2025
3	Karad	220kV Talandage-Tilwani Ckt- I & II	26	CMD-120 dt. 29.01.2025	21.37	218 dt. 07.02.2025
		Total	148			

Part-B- 718 Ckm-Tenders approved in Board

1	Pune	400 kV Talegaon (PG) to Chakan line	17.8	BR No. 172/02 dt. 04.04.2025	55.59	
2	Vashi	220kV Kalwa-Colorchem, 220kV Kalwa-Temghar & 220kV Colorchem-Temghar Line	63.4	BR No. 172/03 dt. 04.04.2025	55.9	
3	Nashik	220kV Gangapur - Shivajinagar Line	96	BR No. 172/04 dt. 04.04.2025	63.67	
4	Nashik	220kV Jamde -Dondaicha 1 & 2 Line	68	BR No. 172/05 dt. 04.04.2025	55.61	
5	Nashik	220kV Malegaon-Shivajinagar line	110	BR No. 172/06 dt. 04.04.2025	87.04	
6	Nashik	220kV Gangapur - Satana line	110	BR No. 172/07 dt. 04.04.2025	86.72	
7	CSN	220kV Solapur PG- Narangwadi DC Line	149	BR No. 172/08 dt. 04.04.2025	116.74	
8	CSN	220kV Beed - Manjarsumba - Patoda Line & 220kV Beed - Patoda Line	104	BR No. 172/09 dt. 04.04.2025	82.58	
		Total	718.2			

[BACK](#)

महापारेषण – अस्तित्वात असलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांचे हाय परफॉर्मन्स कंडक्टरने क्षमता वृद्धिकरण करणे. रु . १५४९.२७ कोटी किमतीच्या १०२२.०२ सर्किट कि.मी.च्या नवीन योजना तयार करणे



महाराष्ट्र शासन

High Performance Conductor (HPC)

Part-C- 392Ckm- Schemes approved in Board					
1	Vashi & Pune	400 kV Kalwa - Talegaon, Kalwa - Kharghar, Kharghar-Talegaon (DC) line	225	BR No. 170/22 dt. 17.01.2025	621.7
2	Nashik	220kV GCR (Eklahare) - Babbleshwar Ckt-1 (Line length - 83.57km) & Ckt-2 (Line length - 83.57km)	167.14	BR No. 170/25 dt. 17.01.2025	241.46
		Total	392.14		

Part-D- 86 Ckm- Schemes approved in Board					
1	Pune	Various EHV 220kV lines under EHV O&M Circle, Pune	86	BR No. 172/14 dt. 04.04.2025	118.57
		Total	86		

Total Line Length 1344.34

BACK

महापारिषद – एअर इन्सुलेटेड स्विचगियर (AIS) चे गॅस इन्सुलेटेड स्विचगियर (GIS) मध्ये रूपांतरण करणे. १० प्रकल्पांची निवड करून निविदा प्रक्रिया सुरु करणे.



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	Name of Substation	Name of Zone	Administrative Approval no.	Tender / Rfx No.	Tender Estimated Cost (in Rs. Crore)	Date of Floating
1	132 KV Harsool	CS Nagar	BR No. 172/16 dt. 04.04.2025	SP/T-0714/0425 (Rfx. No. 7000036135)	97.30	16.04.2025
2	132 kV Jalna MIDC					
3	132kV Jangamwadi					
4	220kV Kalameshwar	Nagpur	BR No. 172/17 dt. 04.04.2025	SP/T-0713/0425 (Rfx. No. 7000036107)	107.69	12.04.2025
5	220kV Kanhan					
6	132kV Mauda					
7	132kV Katol					
8	132kV Ganeshkhind	Pune	BR No. 172/18 dt. 04.04.2025	SP/T-0716/0425 (Rfx No. 7000036136)	82.54	16.04.2025
9	220kV Bhosari - I					
10	220kV Chinchwad - I					
11	220/100/22kV Vasai S/S & 100/22kV Vasai S/s	Vashi	BR No. 172/19 dt. 04.04.2025	SP/T-0711/0425 (Rfx No. 7000036116)	198.78	12.04.2025
12	220/22 kV Nalasopara					
13	220/100kv Kandalgaon			SP/T-0712/0425 (Rfx No. 7000036106)	101.30	12.04.2025

[BACK](#)



महापारेषण – महापारेषण प्रणालीत रिअॅक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे. रु. ३४४.३५ कोटी किमतीच्या ३५०० एम.व्ही.ए.आर च्यारिअॅक्टीव्ह (कॅपॅसिटर) पॉवर कम्पेंसेशन योजनांसाठी निविदा व कार्यादेश जारी करणे

Sr No	Capacitor Bank Tender details	Zone	No of SS	MVar	LOA No & Dt from CE CPA	Order Amt in Crs with GST
Capacitor Bank Phase VI						
1	Cap Bk Phase VI, Tender T 6.1, 22kV, 33kV & 132kV Capacitor Banks	Nashik & Vashi	16	315	Universal/344 dt 10.03.2025	23.57
2	Cap Bk Phase VI, Tender, T 6.4, 11kV, 22kV, 33kV Capacitor Banks	Pune	21	305	Universal/342/ dt 10.03.2025	23.5
3	Cap Bk Phase VI, Tender, T 6.5, 220kV & 132kV Capacitor Banks	Pune	12	405	Shreem/307/ dt. 05.03.2025	30.63
4	Cap Bk Phase VI Tender, T 6.6 100kV & 220kV Capacitor Banks	Vashi	10	325	Shreem/306/ dt. 05.03.2025	32.27
5	Cap Bk Phase VI, Tender, T 6.7 22kV, 33kV & 220kV Capacitor Banks with GIS Bays	Pune & Vashi	8	270	BNC/343 dt. 10.03.2025	74.13
6	Cap Bk Phase VI , Tender T 6.8, 11kV, 22kV & 33kV Capacitor Banks	Pune	16	270	Shreem/569 dt. 25.04.2025	16.33
7	Cap Bk Phase VI Tender, T 6.9, 11kV, 33kV Capacitor Banks	Pune	16	255	Shreem/568 dt. 25.04.2025	18.63
8	Cap Bk Phase VI Tender T 6.10, 11kV & 22kV Capacitor Banks	Pune	14	205	M/s Universal 566 dt. 25.04.2025	16.6
9	Cap Bk Phase VI, Tender, T 6.11 22kV & 33kV Capacitor Banks	Pune	10	145	Shreem 567 /dt. 25.04.2025	13.08
	Sub Total I		123	2495	0	248.74
Capacitor Bank Phase V						
1	Cap Bk Phase V, Tender T 5.4 33kV & 132kV Capacitor Banks	AMT +NGP	19	235	M/s Universal 582/dt. 28.04.2025	21.21
2	Cap Bk Phase V, Tender T 5.5 33kV Capacitor Banks	CSN	18	175	Shreem 571 dt.25.04.2025	17.75
3	Cap Bk Phase V, Tender T 5.6, 22kV & 33kV Capacitor Banks	Karad	16	170	Megnawin 581 dt. 28.04.2025	15.17
4	Cap Bk Phase V, Tender T 5.7 33kV Capacitor Banks	Nashik	14	255	Universal 580 dt.28.04.2025	15.55
5	Cap Bk Phase V, Tender T 5.8 33kV Capacitor Banks	Pune	6	110	Megnawin 572 dt.25.04.2025	8.81
	Sub Total II for Phase V		73	945	-	78.49
Other Schemes						
1	2X132kV Capacitor Bank at 132kV Amgaon SS & 132kV Sakoli SS	Nagpur	2	60	M/s Lomte/888 dt.25.04.2025 (By CE, Nagpur Zone)	4.7
	Sub Total III for other schemes		2	60		4.7
	Grand Total I+II+III		198	3500		331.93



महापारेषण – महापारेषण प्रणालीत रिअॅक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे.

सध्याच्या ४०७५एम.व्ही.ए.आर (रिअॅक्टर) च्या स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत, २४६.२६ कोटी किमतीच्या १४४५ एम.व्ही.ए.आर च्या निविदा मागवणे

Sr. No	Zone	Name of Scheme	Scheme Cost in Crs	Total MVAR	Procurement Tender Details	Tender Publication Date	ETC Tender Details	Tender Publication Date
1	CSN	Scheme of SIT&C of new 5x50MVA switchable 400 kV Line Reactors against replacement of old 5x50 MVA at 400kV Girwali SS under Chh.Sambhaji Nagar Zone. BR. No.168/45 Dt.22.07.2024	54.16	250	SP/T-0503/0325 RFx 5000001378 3rd Call	29.03.2025	SP/T-0509/0425_ETC RFx 7000036029 4th Call	07.04.2025
2	CSN	Scheme of SIT&C of 1x125MVAR bus reactor at 400kV Waluj s/s 24.70 Crs BR. No.170/19 Dt. 17.01.2025	24.70	125	SP/T-0504/0325 RFx 5000001379 1st Call	29.03.2025	SP/T-0510/0425_ETC RFx 7000036040 1st Call	07.04.2025
3	CSN	Scheme of SIT&C of 2X80 MVAR, 3 phase, 400kVLine Reactors with bay equipment at 400kV Kumbhargao (Nanded) s/s along with associated civil work. BR. No.172/21 Dt. 04.04.2025	37.66	160	SP/T-0513/0425 RFx 5000001392 1st Call	12.04.2025	SP/T-0515/0425_ETC RFx 7000036108 1st Call	22.04.2025
4	Karad	Scheme of SIT&C of 400 kV, 125 MVA Bus Reactor at 400 kV R.S. New Koyna under Karad zone. BR No. 166/19 Dt. 19.01.2024	21.53	125	SP/T-0518/0824 RFx 5000001272 3rd Call	22.08.2024	SP/T-0514/0425 ETC RFx 7000036035 5th Call	12.04.2025
5	Nagpur	Scheme of SIT&C of 125 MVA, 400kV Bus Reactor along with new bay and allied equipment, At 400kV Chandrapur Switching S/s BR No. 167/46 Dt. 04.03.2024	16.02	125	SP/T-0518/0824 RFx 5000001272 3rd Call	22.08.2024	SP/T-0514/0425_ETC RFx 7000036035 5th Call	09.04.2025
6	Nashik	Scheme of SIT&C of 1X125 MVA 400kVBus Reactor along with allieded bay at 400kV Khadka SS by (Repl 2x50 by 80 MVA) BR. No. 170/18 Dt. 17.01.2025	50.25	285	SP/T-0503/0325 RFx 5000001378 3rd Call	29.03.2025	SP/T-0508/0425_ETC RFx 6000001324 6th Call	05.04.2025
7	Pune	Scheme of SIT&C of 125 MVA, 400kV Bus Reactor along with new bay and allied equipment, at i) At 400kV Chakan S/s under Pune Zone ii) At 400kV Lonikand-I S/s , by replacement of old 50 MVA, 400kV Bus Reactor by new 125 MVA Reactot under Pune Zone. BR No. 167/46 Dt. 04.03.2024	28.83	250	SP/T-0518/0824 RFx 5000001272 3rd Call	22.08.2024	SSP/T-0512/0425_ETC RFx 7000036063 6th Call	09.04.2025
8	Vashi	Scheme of SIT&C of 1x125MVAR bus reactor at 400kV Kudus s/s BR. No.170/21 Dt. 17.01.2025	23.79	125	SP/T-0504/0325 RFx 5000001379 1st call	29.03.2025	SP/T-0507/0425_ETC RFx 6000001307 1st Call	05.04.2025.
		Total-I Cost and MVAR (Reactor)	257	1445				
		Supply & ETC Tenders floated MVAR		1445				

महापारिषद – महाराष्ट्रात SCED पायलट प्रकल्प सुरु करणे.



महाराष्ट्र शासन

1. Seeking approval of MERC for implementation of pilot.

MERC order- Hon MERC permitted to go ahead with this pilot project as an outcome of IA 43 of 2025 in case no. 51 of 2025

2. Designing the system architecture for the SCED pilot project. This includes determining the necessary hardware and software components, data flows, and interfaces between the existing systems and the SCED module.

The architecture, internal design for SCED pilot project is already finalized.

3. Identification and allocation of necessary human resources

MSLDC issued an internal Notification for calling interest of engineers to work at MSLDC and ALDC and in response to it, 12 no of engineers are selected by a committee.

4. Capacity building of internal resources.

O.O. 125 dated 28.04.2025 and O.O. No 77 dated 19.03.2025- total 12 numbers of engineers posted as per the selection by the committee.

5. Identification of agency for allied developments for data interfacing with existing systems.

M/s PWC has developed the DSM software vide work order no. CESLDC/Tech/EA/DSM/WO 2093 dated 20.09.2019. The development work of SCED interface to this DSM software can be done through change request (CR) work order for which the man-day rate is established.

[BACK](#)

महापारेषण - आंतर-राज्य पारेषण प्रणालीला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांवर आधारित प्रकल्पांना ग्रिड जोडणी मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा



महाराष्ट्र शासन



STATE TRANSMISSION UTILITY

Date:

Notification

Sub.: Implementation of Revised Procedure for grant of Grid Connectivity to projects based on Renewable Energy sources to Intra-State Transmission System.

MSETCL as STU has to process the Grid Connectivity applications for allotment of Transmission Capacity in intra-state Transmission System. Renewable Energy developers apply for grid connectivity and STU issues Grid Connectivity to said projects by following regular official procedure as per prevailing RE Policy and MERC regulations & approved GC procedure.

In view of MERC order no. Dt. 19/09/2019 in Case No. 235 of 2019, implementation of TOA Regulation, RE Policy 2020 & methodology and CERC (Connectivity and General Network Access to the inter-State transmission System) Regulations, 2024 Dt. 19/06/2024, the Draft revised procedure for grant of Grid connectivity to Generating projects based on Renewable Energy sources to Intra-State Transmission System has been prepared by STU.

Draft Revised Procedure for grant of Grid Connectivity to projects based on RE sources was published on MSETCL website and Stakeholders feedback/Comments were invited. After meeting with Stakeholder, the revised procedure for grant of Grid connectivity to Generating projects based on Renewable Energy sources to Intra-State Transmission System has been prepared by incorporating valid Comments of Stakeholder.

The Revised Procedure for grant of Grid Connectivity to projects based on Renewable Energy sources to Intra-State Transmission System is enclosed herewith and will come into effect from 00:00 Hrs. of 07/01/2025.

Please note that, for the applications received prior to date of the coming into effect of said revised procedure, the applications shall be treated as per Clause No. 2.2 of this Procedure. Applicant will have the option of, either to withdraw/close the application by replying to STU communication seeking consent, or to convert the application as an application made under this Procedure by complying with the requirements under this Procedure, which shall be processed in accordance with this Procedure.



Sub.: Implementation of Revised Procedure for grant of Grid Connectivity to projects based on Renewable Energy sources to Intra-State Transmission System.

Further, renewable energy projects which have been granted grid connectivity to InSTS prior to date of approval of this Procedure and the same are yet to be granted Final Grid Connectivity, shall be reviewed as per revised timelines applicable and stipulated Clause No. 9.4 & 9.5 of this Procedure.

The process of incorporating suitable preliminary changes in Single Window Portal is being carried out and will be effective from 00:00 Hrs. of 07/01/2025. Thus the applications can be processed as per the Revised Grid Connectivity Procedure.

Further, the detailed modification in the SWP according to the Revised Grid Connectivity Procedure are taken up and shall be completed in targeted time period.

(Peeyush Sharma)
Chief Engineer (STU)

BACK

महापारिषण – परावर्तन क्षमतेत वाढ करणे in MSETCL Network रु. १४७३ कोटी किमतीच्या १०५५५

एम.व्ही.ए च्या योजनांसाठी निविदा जारी करण्याचे नियोजन आहे.



महाराष्ट्र शासन

Sr. No.	Zone	Scope of Work	MVA Added	Tender Rfx No.
1	CSN	220kV Georai -2x25MVA, 220/33kV T/Fs	50	7000033385
2	Vashi	220kV ONGC Panvel S/s- 1X50MVA, 220/33kV TF 220KV colourchem S/stn- 2x(100-50) MVA, 220/22-22kV T/Fs	150	7000034376
3	Nashik	220kV Sayane- 1X50MVA, 220/33kV	50	7000029888
4	Amravati	220kV Malegaon Zodga- 1x100MVA, 220/132kV ICT	100	7000034176
5	Pune	132kV Karajgi S/s- 2X(50-25)MVA, 132/33KV T/Fs	50	7000034288
6	Amravati	132kV Arni S/s-1x25MVA, 132/33kV T/F	25	7000034701
7	Amravati	220kV Malkapur S/s-1x100MVA, 220/132kV ICT	100	7000035270
8	CSN	132kV Soygaon S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Sillod S/s - 1 X 50 MVA 132/33kV T/F 132kV Mantha S/s - 2x(50-25) MVA, 132/33kV T/Fs	150	7000031156
9	CSN	220kV Krushnoor S/s - 1x50 MVA, 220/33kV T/F 220kV Bhokar S/s - 2x(50-25) MVA, 220/33kV T/Fs 132kV Umari S/s - 2x(50-25) MVA, 132/33kV T/Fs	150	7000030849
10	Nagpur	220kV Gadchiroli - 1x(100-50), 220/132kV ICT 220kV Hinganghat - 1x(100-80), 220/132kV ICT 220kV Butibori S/s - 2x(200-100), 220/132kV ICTs	270	7000034277
11	Nashik	1X50 MVA, 132/33kV T/F, 132kV Shevgaon S/s 1x25MVA, 132/33kV T/F, 132kV Newasa S/s	75	7000034433
12	Amravati	132kV Partur-2X (50-25) MVA 132/33kV 132kV Murtizapur S/s-2X (50-25) MVA 132/33kV	100	7000031302
13	Nagpur	132kV Hingna 1- 1X50MVA, 132/33kV T/F 132kV Bharsingi - 2X(50-25)MVA, 132/33kV T/Fs	100	7000034267
14	Nagpur	132kV Hingna-2 1X50MVA, 132/33kV T/F 220kV Kaulewada- 2X(50-25)MVA, 220/33KV T/F	100	7000032661
15	Amravati	132kV Digras S/s - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 132kV Pandharkawada S/s - 2x(50-25) MVA, 132/33kV T/Fs	75	7000034283
16	Amravati	132kV Karanja S/s - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 132kV Mangrulpir S/s - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 132kV Malegaon S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F	100	7000035251
17	CSN	765 kV Ektun-3 X 500 MVA, 765/400/33 kV ICT	1500	6000001284
18	Nashik	132kV Ambad S/s - 1X50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Sinner Old S/s - 1x50MVA, 132/33kV T/F	100	7000036087
19	Nashik	132kV Wadzire S/s- 1X50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Karjat S/s - 1X50 MVA, 132/33kV T/F	100	7000036089
20	Karad	400kV R.S. Dn., Talandge-3X167 MVA, 400/220/33kV ICT a	500	7000033818

BACK

महापारिषण - परावर्तन क्षमतेत वाढ करणे in MSETCL Network रु. १४७३ कोटी किमतीच्या १०५५५



महाराष्ट्र शासन

एम.व्ही.ए च्या योजनांसाठी निविदा जारी करण्याचे नियोजन आहे.

Sr. No.	Zone	Scope of Work	MVA Added	Tender Rfx No.
21	Amravati	400/220/33 kV Akola- 4 X (167-105) MVA 400/220/33 kV ICT	185	7000036105
22	Nashik	132kV Ranwad S/s-1X50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Ramache Pimplas S/s-1x25MVA, 132/33kV T/F,	75	7000036088
23	Pune	400kV Lonikand-II-2X(200-100), 220/132kV ICTs 220kV Chakan-II-2X(200-100), 220/132kV ICTs 220kV Alephata -2X(200-100), 220/132kV ICTs	600	7000031744
24	Vashi	220kV Anandnagar- 1x50 MVA, 220/22 kV T/F 100kV Ambernath- 1X50 MVA, 100/22kV T/F a	100	7000033690
25	Pune	220kV Bridgestone S/s-1X50MVA, 220/33kV T/F 220kV Ranjangaon S/s - 1X50MVA, 220/22kV T/F	100	7000034417
26	Pune	400kV Chakan S/s-1X50MVA, 220/22kV T/F	50	7000032496
27	Karad	110kV Jaysingpur - 1x(50-25)MVA, 110/33kV T/F 220kV Halkarni - - 1x(50-25)MVA, 220/33kV T/F 110kV Kurundwad S/s - 1x25MVA, 132-110/33kV T/F	100	7000034514
28	Amravati	220kV Badnera S/s - 1x50 MVA , 132/33kV T/F 220kV Dhamangaon S/s-2x(50-25) MVA, 220/33kV T/Fs	100	7000033677
29	Pune	400 kV Jejuri S/s - 3X167 MVA 400/220/33kV ICT	500	7000033704
30	CSN	220kV Narangwadi - 1x100MVA, 220/132kV ICT 220kV Jalkot - 1x100MVA, 220/132kV ICT 220kV Paranda - 1x100MVA, 220/132kV ICT	300	7000033894
31	Nagpur	220kV Kanhan S/s - 2x(50-25) MVA, 220/33kV T/Fs 220kV Umred S/s - 1x25 MVA, 220/33kV T/F 132kV Saoner S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F	125	7000034507
32	Pune	220kV Pirangut S/s - 1X50MVA, 220/22kV T/F 132kV Rahatani S/s - 1X50MVA, 132/22kV T/F	100	7000032541
33	Nashik	132kV Nardana S/s - 1X25MVA, 132/33kV TF 220kV Raymond - 1X25MVA, 220/33kV TF	50	7000035513
34	Nashik	400kV R.S. Dhule - 4x167 MVA, 400/220/33 ICT	500	7000035434
35	Pune	400kV Lonikand-IS/s - 3X167 MVA, 400/220/33kV ICT	500	7000030741
36	CSN	220/132kV Padegaon S/s - 2X50MVA, 220/33kV T/Fs	100	7000033919
37	Pune	132kV Janai - 1x25MVA, 132/33kV T/F 132kV Someshwarnagar - 1x25MVA, 132/33kV T/F 220kV Jejuri S/s - 1x50MVA, 220/33kV T/F	100	7000033668
38	Nashik	220KV Shivajinagar - 1x100MVA, 220/132kV ICT 220kV Manmad S/s - 2x(200-100)MVA, 220/132kV ICTs	300	7000035217
39	Nashik	220kV Shivajinagar S/s - 1X100MVA, 220/33kV/33kV T/F 132kV Samsherpur S/s - 1X25MVA, 132/33kV T/F	125	7000035448
40	Karad	220 kV Vita S/s - 1 x 50 MVA, 220/33 kV T/F 110 kV Dighanchi S/s - 2 x (50-25) MVA, 132-110/33 kV T/Fs 132 kV Kundal S/s - 2 x (50-25) MVA, 132-110/33 kV T/Fs 132 kV Wai S/s - 1 x (50-25) MVA, 132/33 kV T/Fs	125	7000034059

BACK



महाराष्ट्र शासन

BACK

महापारिषण -परावर्तन क्षमतेत वाढ करणे in MSETCL Network रु. १४७३ कोटी किमतीच्या १०५५५ एम.व्ही.ए च्या योजनांसाठी निविदा जारी करण्याचे नियोजन आहे.

Sr. No.	Zone	Scope of Work	MVA Added	Tender Rfx No.
41	Nagpur	132kV Sakoli - 1x50MVA, 132/33kV T/F 132kV Amgaon - 1x50MVA, 132/33kV T/F	100	7000035355
42	Karad	110kV Rethare S/s - 1X25 MVA, 132-110/11kV T/F	25	7000034780
43	Nagpur	132kV Lakhandur - 1x25MVA, 132/33kV T/F 132kV Ambhora S/s - 2x50-25)MVA, 132/33kV T/Fs	75	7000034743
44	Nashik	132kV Khandke S/s - 1x50MVA, 132/33kV T/F 132kV Ghodegaon S/s - 1x50MVA, 132/33kV T/F	100	7000035435
45	Nashik	132kV Parola S/s - 2x(50-25)MVA, 132/33kV T/Fs 132kV New MIDC Jalgaon S/s - 1X50MVA, 220/33 kV T/F 132kV Dharangaon S/s - 2x(50-25)MVA, 132/33kV T/Fs	150	7000035447
46	Pune	132 kV Mohol S/s - 1x50 MVA, 132/33 Kv T/F	50	7000034368
47	Nagpur	400 kV Koradi II S/s - 4x167MVA MVA, 400/220/33 kV ICT	500	7000035536
48	Pune	220kV Century Enka S/s - 2x50MVA, 220/22kV T/Fs	100	7000035838
49	Vashi	220/100/22 kV Bapgaon S/s - 1x50 MVA, 220/22 kV T/F	50	7000034815
50	Vashi	220/22 kV Mahape S/s - 2x(100-50) MVA, 220/22 kV, 220/22-22 kV T/Fs	100	7000034814
51	Vashi	220 kV Temghar S/s - 1x(100-50) MVA, 220/22 kV, 220/22-22 kV T/F	50	7000034883
52	Vashi	220 KV Kolshet S/s - 1x(100-50) MVA, 220/22 kV, 220/22-22 kV T/F	50	7000034816
53	CSN	220kV Chitegaon S/s - 1x50 MVA, 220/33kV T/F	50	7000035406
54	Amravati	220kV Chikhali S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Buldhana S/s - 1x25 MVA, 132/33kV T/F	75	7000035250
55	Amravati	132kV Mehkar S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F 132kV Khamgaon S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F, 132kV Dugarbid S/s - 2x(50-25) MVA, 132/33kV T/Fs	150	7000035249
56	Nagpur	132kV Seloo S/s - 2x(50-25) MVA, 132/33kV T/Fs 132kV Mouda S/s - 1x50 MVA, 132/33kV T/F	100	7000035396
57	Karad	110kV Sankh S/s - 1X50 MVA, 132-110/33kV T/F	50	7000036012
58	CSN	132 kV Vaijapur S/stn - 50 MVA, 132/33 kV TF 132kV Udgir S/stn- 1x(50-25)MVA, 132/33 kV TF	75	7000035906
59	CSN	132kV Ghansawangi - 2x(50-25)MVA, 132/33kV T/Fs 132kV Chikalthana - 1x50MVA 132/33kV T/F 132kV Paithan - 1x50 MVA, 132/33kV T/F, 220kV Shendra - 1x50 MVA, 220/33kV T/F	200	7000032454
60	CSN	220kV Bhokardan - 1x25 MVA, 220/33kV T/F 132kV Purna - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 132kV Jintur - 1x50 MVA, 132/33kV T/F, 132kV Ardhapur - 2x(50-25)MVA, 132/33kV T/Fs	150	7000031157
61	CSN	Addition of Power Transformers 1) 132kV Sengaon - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 2) 132kV Hingoli - 1x50 MVA, 132/33kV T/F 3) 132kV Parbhani - 1x50 MVA, 132/33kV T/F 4) 132kV Kagzipura - 1x25 MVA, 132/33kV T/F 5) 220kV Hingoli - 1x25 MVA, 220/33kV T/F 6) 132kV Kinwat - 1x25 MVA, 132/33kV T/F	200	7000034875
62	Karad	110 kV Shirol S/s - 1 x 50 MVA, 132/33 kV T/F . 132 kV Kudal S/Stn - 1 x (50-25) MVA, 132/33 kV T/F	75	7000034106
63	Nashik	220kV Manmad S/s- 1x(50-25)MVA 132/33kV 132kV Chandwad S/s - 2x(50-25)MVA 132/33kV T/Fs	75	7000035197
64	Nashik	132kV Nampur S/s - 1X25 MVA, 132/33kV T/F	25	7000034950
		Total	10555	


महापारिषद - नवीन प्रकल्प योजनांच्या अचूक आणि सुस्पष्ट सूत्रीकरणासाठी २५०० कोटी रुपयांचे ०९ प्रकल्प प्रशासकीय मंजूरी आणि एमईआरसी मंजूरीसाठी प्रस्तावित आहेत



महाराष्ट्र शासन

S.No.	Name of Schemes	Zone	BR no.& date	Estt. Cost in Rs. Cr.	MERC Status
1	132 kV level creation / ICT addition at 220/33 kV Patoda Ss Tal. & Dist. Beed	CSN	170/54 dtd. 17.01.2025	92	Cancelled by STU
2	Conversion of 400 kV SCS C line into DCDC line from Kalwa to Padgha Ckt I & II - 60 Kms	Vashi	170/53 dtd. 17.01.2025	963	DPR will be submitted on 31.07.2025
3	220/22 KV Smart Suraksha City , Dist Palghar	Vashi	170/50 dtd. 17.01.2025	147	DPR submitted on 31.01.2025
4	Establishment of 400/220 kV GIS-I s/s at Kalwa , Dist.- Thane	Vashi	170/52 dtd. 17.01.2025	874	DPR submitted on 30.04.2025
5	220kV Additional Butibori s/s ,	Nagpur	171/21 dtd.27.03.2025	119	DPR submitted on 30.04.2025
6	Evacuation arrangement for 2X660 MW generation of Koradi (New)	Nagpur	172/25 dtd. 04.04.2025	72	DPR submitted on 30.04.2025
7	132kV Puikhade - Kale-Conversion of 110kV to 132kV.	Karad	CMD dtd. 02.04.2025	15	DPR submitted on 30.04.2025
8	132kV Shirsoli S/s Dist. Jalgaon (Rs, 66 Cr.)	Nashik	169/15 dtd. 27.09.2024		DPR submitted on 30.04.2025
9	220/132/33 kV Waghdari s/s Dist. Solapur	Vashi	170/53 dtd. 17.01.2025	229	DPR submitted on 17.04.2025
10	Establishment of 400 kV Velgaon ss (Rs. 525 Cr.)	Vashi	172/26 dtd. 04.04.2025 RFP Published	525	RFP Published by STU
11	132/33 kV Selu s/s Dist. Parbhani (Rs., 47 Cr)	CSN	166/06 dtd. 19.01.2024		DPR submitted on 31.01.2025
Total				3035	

[BACK](#)



महाऊर्जा - महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण अंतर्गत अँकर युनिटसाठी निविदा



महाराष्ट्र शासन



MAHARASHTRA ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (MEDA)

(A Government of Maharashtra Institution)

Aundh Road, Opposite Spicer Collage, Near Commissionerate of Animal Husbandry, Aundh, Pune -411007

Tel.: 020-35000450, Website: www.mahaurja.com, Email: gmghc@mahaurja.com

INVITES for Tender

MEDA invites Tender for Selection of Green Hydrogen Producers for Setting up Projects for Green Hydrogen Production Facilities (Anchor Units & Experimental Anchor Units) in the Maharashtra State as per Maharashtra Green Hydrogen Policy-2023. All these Anchor Unit & Experimental Anchor Units will be selected through a bid selection process.

For detailed information of Tender, Applicants are requested to visit <http://mahatenders.gov.in> website. The date of publication of Tender is 30/04/2025 & the last date of submission of tender offer is 04/07/2025 at 15:00 Hrs.

Director General, MEDA reserves the right to accept or reject anyone or all the tender without assigning any reasons thereof.

Sd/-
Director General, MEDA



महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)

(महाराष्ट्र शासनाची संस्था)

औंध रोड, पशुसंवर्धन आयुक्तालयाशेजारी, स्पायसर कॉलेज समोर, औंध, पुणे - ४११००७.

दूरध्वनी क्र.: ०२०-३५०००४५०, ई-मेल आयडी : gmghc@mahaurja.com, संकेत स्थळ (website) www.mahaurja.com

ई-निविदा सूचना

महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात हरित हायड्रोजन उत्पादन सुविधा प्रकल्प (अँकर युनिट आणि प्रायोगिक अँकर युनिट) स्थापन करणेचे आहेत. या सर्व अँकर युनिट आणि प्रायोगिक अँकर युनिटची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. या कामासाठी महाऊर्जाद्वारे हरित हायड्रोजन विकासकांकडून ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत.

ई-निविदेच्या सविस्तर माहितीसाठी <http://mahatenders.gov.in> या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. ई-निविदा विक्री कालावधी दि. ३०/०४/२०२५ ते दि. ०४/०७/२०२५ वेळ ३:०० वा. असणार आहे. प्राप्त होणाऱ्या ई-निविदा स्विकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे अधिकार मा. महासंचालक, महाऊर्जा यांच्याकडे राहतील.

महासंचालक, महाऊर्जा

BACK



महाराष्ट्र शासन

धन्यवाद..!

ऊर्जा विभाग
महाराष्ट्र शासन
