

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०) कार्य शाखा



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

**01.05.2026 को चल रहे केन्द्रीय विद्यालय
भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति**

01.05.2026 को चल रहे केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति (राज्यवार)

बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित अर्थात् पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन

क्र. संख्या / Sl. No.	के.वि. का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की (राशि लाख में)/ AA&ES (Rs. In lakh)	संस्वीकृति की तारीख/ Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख/ Stipulated Date of Completion	30.04.2026 तक निर्मुक्त राशि (लाख में) /Amount released till 30.04.2026 (Rs. In lakh)	शेष देयता (लाख में) / Balance Liabilit (Rs. In lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(अ) विद्यालय भवन निर्माणाधीन

अरुणाचल प्रदेश

01	दापोरिजो ('A-1' Type + 09SQ+BW)	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	40%	31.12.2026	1620.00	1124.03	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



02	जीरो ('A-1' Type + 09SQ+BW)	2058.49	23.06.2022	APPWD	Dec 2023	48%	Dec 2026	1120.00	938.49	
----	-----------------------------	---------	------------	-------	----------	-----	----------	---------	--------	--



03	डिब्रूगढ़ (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	57%	24.01.2027	3020.00	763.81	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



04	आरडबल्यूपी बेला (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3715.00	22.11.2016 09.12.2024	CPWD	19.12.2025	67%	30.06.2026	3470.00	245.00	
----	---	---------	--------------------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



हिमाचल प्रदेश

05	रिकांग पिओ, किनौर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	78%	31.10.2026	4170.00	273.00	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



जम्मू और कश्मीर

06	साम्बा (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	35%	23.08.2026	1400.00	265.43	
----	---------------------------------	---------	------------	-----	------------	-----	------------	---------	--------	--



07	दमना (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	38%	31.08.2026	1920.00	804.56	
----	--------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



कर्नाटक

08	हावेरी (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2134.00	28.06.2021	FEDO	22.09.2025	40%	01.06.2026	1420.00	714.00	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--




09	गौरीबिदनूर (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	43%	31.07.2026	2170.00	589.98	
----	-------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



मध्य प्रदेश

10	हरदा (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	48%	31.08.2026	2070.00	253.15	
----	-------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

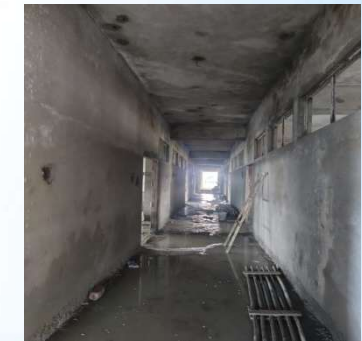

11	अनूपपुर (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2843.86	07.10.2024	CPWD	05.10.2025	23%	04.10.2026	1440.00	1403.86	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--





महाराष्ट्र

12	यावतमल (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2885.20	10.07.2023	CPWD	01.01.2025	65%	06.09.2026	2120.00	765.20	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



मणिपुर

13	तमेंगलॉग (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	40%	31.03.2026	3520.00	762.20	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

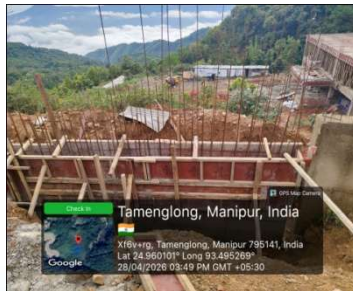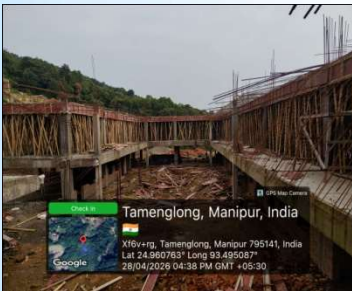

14	नं. 1 इम्फाल (‘C’ Type + 09SQ+BW)	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	62%	31.12.2026	4720.00	2056.86	
----	--------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



15	नं. 3 इम्फाल लैमखोंग (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	35%	16.08.2026	1470.00	2023.77
----	--	---------	------------	-----	------------	-----	------------	---------	---------



16	उखरुल (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.03.2027	1020.00	1738.62
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------



17	नं. 2 इम्फाल (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	5819.59	25.05.2023	CPWD	11.09.2025	13%	10.09.2027	3520.00	2299.59
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------



नागालैंड

18	रंगापहार (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	03%	120.00	1983.43	
----	------------------------------------	---------	------------	-----	------------	-----	-------	--------	---------	--



ओडिशा

19	हिंजिलिकट (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	82%	31.03.2026	2320.00	474.47	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



20	खारियार (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3061.62	04.01.2022	CPWD	08.09.2023	97%	31.03.2026	2720.00	341.62	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



21	गुणपुर ('A' Type + 09SQ+BW)	3240.13	02.02.2023	CPWD	28.03.2025	13%	27.09.2026	2220.00	1020.13	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



राजस्थान

22	जैसिन्धर ('A' Type + 09SQ+BW)	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	70%	30.06.2026	1620.00	1162.02	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



तमिलनाडु

23	रामेश्वरम ('A' Type + 09SQ+BW)	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	33%	31.12.2026	2120.00	438.83	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



त्रिपुरा

24	गोकुलनगर (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	3604.15	12.03.2024	CPWD	25.12.2024	35%	04.12.2026	2320.00	1284.15	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



उत्तर प्रदेश

25	एसएसबी गदनीय पालिया कला (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	55%	30.11.2026	1420.00	1237.19	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



26	लखीमपुर खेरी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	75%	30.06.2026	1970.00	768.87	
----	--------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



27	एसएसबी नानपारा बहराइच (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	44%	31.08.2026	720.00	1532.56	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	--------	---------	--




28	चित्रकूट (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2775.56	14.01.2025	CPWD	11.07.2025	22%	31.01.2027	1820.00	955.56	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--






उत्तराखंड

29	न्यू टिहरी टाउन (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4292.81	29.11.2022	NPCC	27.01.2024	79%	31.03.2026	4000.00	292.81	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

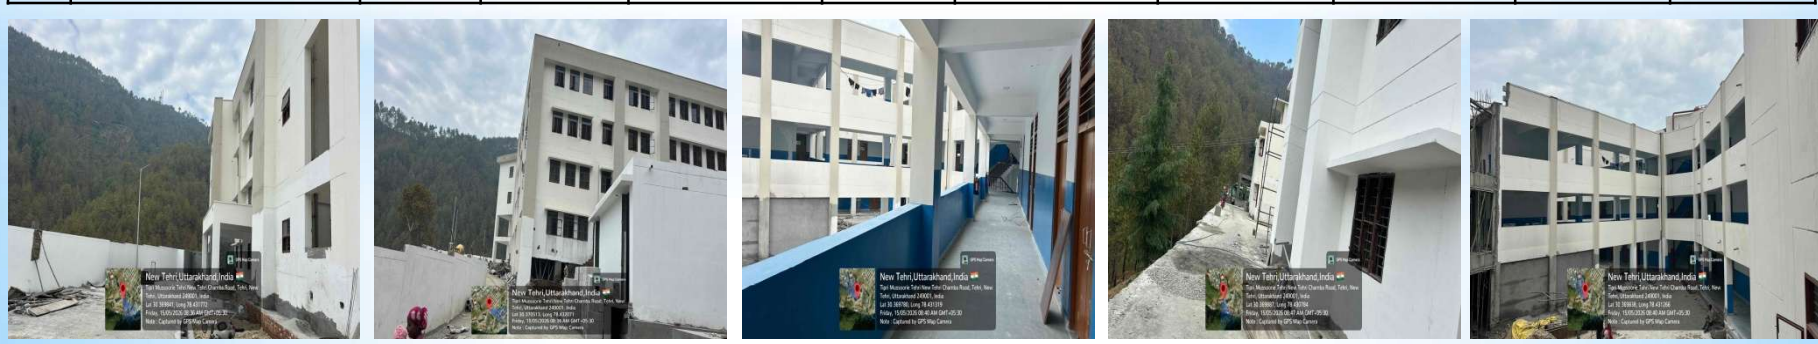

पश्चिम बंगाल



30	एन एफ आर जलपाईगुरी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	75%	12.04.2026	2720.00	1137.43	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--

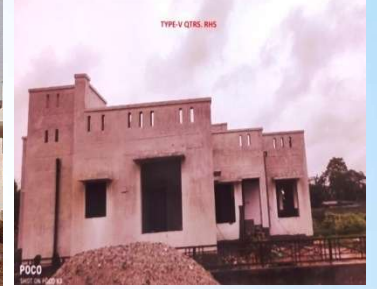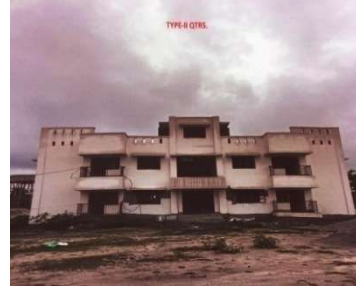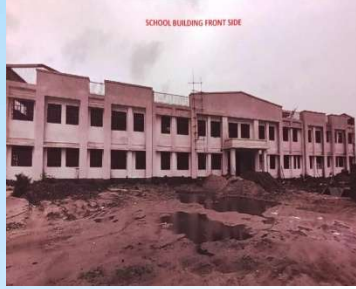

31	सी आर पी एफ सिलीगुड़ी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	60%	31.10.2026	2020.00	1249.74	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



32	बी एस एफ कृष्णानगर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	86%	31.03.2026	3420.00	252.98	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

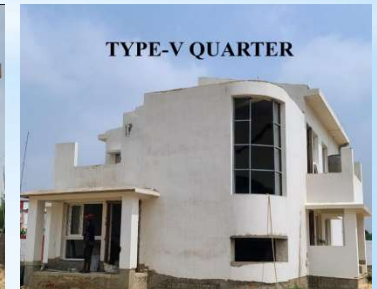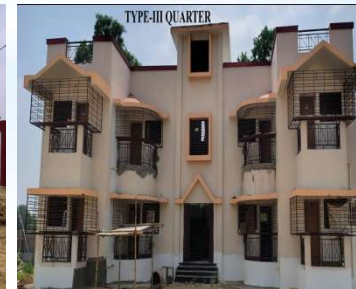

33	बोलपुर (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2046.13	06.03.2023	CPWD	05.02.2025	55%	04.08.2026	1720.00	326.13
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------



34	सी आर पी एफ दुर्गापुर (‘B’ Type + 09SQ+BW)	3637.61	18.07.2023	CPWD	05.05.2025	35%	04.11.2026	2170.00	1467.61
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------



35	तारकेश्वर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	40%	15.08.2026	2120.00	1740.11
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------



WORK YET TO BE STARTED

बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित अर्थात पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन

क्र. संख्या / Sl. No.	के.वि. का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की (राशि लाख में) / AA&ES (Rs. In lakh)	संस्वीकृति की तारीख/ Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख/ Stipulated Date of Completion	30.04.2026 तक निर्मुक्त राशि (लाख में) /Amount released till 30.04.2026 (Rs. In lakh)	शेष देयता (लाख में) / Balance Liabilit (Rs. In lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अ) विद्यालय भवन निर्माणाधीन										
अरुणाचल प्रदेश										
01	बंका/Banka ('A' Type + 09SQ+BW)	4062.65	15.10.2025	CPWD	-----	0%	-----	420.00	3642.65	
दिल्ली										
02	नं. 4 दिल्ली कैंट ('A' Type + 09SQ+BW)	2286.82	11.10.2024	MES	-----	0%	-----	1720.00	566.82	
हरियाणा										
03	जीसी सीआरपीएफ सोनीपत ('A' Type + 09SQ+BW)	2955.39	08.09.2022	CPWD	-----	0%	-----	1220.00	1735.39	
04	बिलासपुर ('A' Type + 09SQ+BW)	2667.77	15.03.2025	CPWD	-----	0%	-----	1020.00	1647.77	
ओडिशा										
05	नं. 2 कटक ('A' Type + 09SQ+BW)	3954.00	22.08.2025	CPWD	-----	0%	-----	1720.00	2234.00	

तेलंगाना										
06	महबूबाबाद (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2259.51	16.01.2025	CPWD	-----	0%	-----	210.48	2049.03	

उत्तराखंड										
07	अगस्त्यमुनि (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4446.19	19.10.2022	CPWD	-----	0%	-----	1720.00	2726.19	
