

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०) कार्य शाखा



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

01.07.2026 को चल रहे केन्द्रीय विद्यालय
भवनो के निर्माण कार्य की स्थिति

01.07.2026 को चल रहे केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति (राज्यवार)


बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित अर्थात पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन

क्र. संख्या / Sl. No.	के.वि. का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की (राशि लाख में) / AA&ES (Rs. In lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.06.2026 तक निर्मुक्त राशि (लाख में) / Amount released till 30.06.2026 (Rs. In lakh)	शेष देयता (लाख में) / Balance Liabilit (Rs. In lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(अ) विद्यालय भवन निर्माणाधीन

अरुणाचल प्रदेश

01	दापोरिजो (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	50%	31.12.2026	1620.00	1124.03	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--

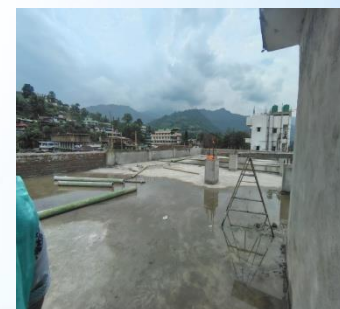

02	ज़ीरो (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2058.49	23.06.2022	APPWD	Dec 2023	52%	Dec 2026	1120.00	938.49	
----	---------------------------------	---------	------------	-------	----------	-----	----------	---------	--------	--



03	डिब्रूगढ़ (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	70%	24.01.2027	3020.00	763.81	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



04	आरडबल्यूपी बेला (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3715.00	22.11.2016 09.12.2024	CPWD	19.12.2025	67%	30.06.2026	3470.00	245.00	
----	---	---------	--------------------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



हरियाणा

05	बिलासपुर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2667.77	15.03.2025	CPWD	05.02.2026	08%	30.04.2027	1020.00	1647.77	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



हिमाचल प्रदेश

06	रिकांग पिओ, किनौर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	80%	31.10.2026	4170.00	273.00	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



जम्मू और कश्मीर

07	साम्बा (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	35%	23.08.2026	1400.00	265.43	
----	---------------------------------	---------	------------	-----	------------	-----	------------	---------	--------	--



08	दमाना (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	38%	31.03.2027	1920.00	804.56	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



कर्नाटक

09	हावेरी (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2134.00	28.06.2021	FEDO	22.09.2025	40%	01.06.2026	1420.00	714.00	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



10	गौरीबिदनूर (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	53%	31.07.2026	2170.00	589.98	
----	-------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



मध्य प्रदेश

11	हरदा (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	48%	31.08.2026	2070.00	253.15	
----	-------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--




12	अनूपपुर (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2843.86	07.10.2024	CPWD	05.10.2025	40%	04.10.2026	1440.00	1403.86	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--




महाराष्ट्र

13	यावतमल (‘A-’ Type + 09SQ+BW)	2885.20	10.07.2023	CPWD	01.01.2025	75%	06.09.2026	2120.00	765.20	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

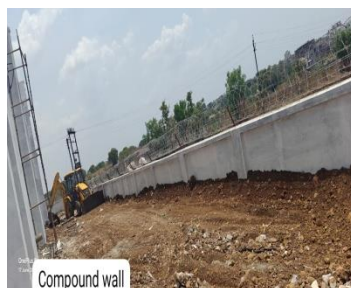

मणिपुर

14	तमेंगलॉग (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	43%	31.03.2026	3520.00	762.20	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

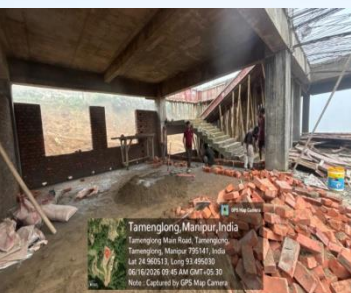

15	नं. 1 इम्फाल (‘C’ Type + 09SQ+BW)	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	67%	31.12.2026	4720.00	2056.86	
----	--------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



16	नं. 3 इम्फाल लैमखोंग (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	45%	16.08.2026	1470.00	2023.77	
----	--	---------	------------	-----	------------	-----	------------	---------	---------	--



17	उखरुल (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.03.2027	1020.00	1738.62	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



18	नं. 2 इम्फाल (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	5819.59	25.05.2023	CPWD	11.09.2025	13%	10.09.2027	3520.00	2299.59	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--




नागालैंड

19	रंगापहार (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	04%		120.00	1983.43	
----	------------------------------------	---------	------------	-----	------------	-----	-------	--------	---------	--



ओडिशा

20	हिंजिलिकट (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	82%	31.03.2026	2320.00	474.47	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

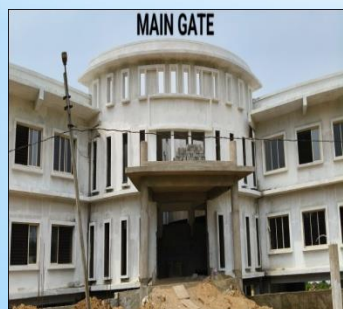

21	खारियार (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3061.62	04.01.2022	CPWD	08.09.2023	98%	31.03.2026	2720.00	341.62	
----	---------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



22	गुणपुर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3240.13	02.02.2023	CPWD	28.03.2025	13%	27.09.2026	2220.00	1020.13	
----	--------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



23	नं. 2 कटक (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3954.00	22.08.2025	CPWD	22.12.2025	10%	21.04.2027	1720.00	2234.00	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



राजस्थान

24	जैसिन्धर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	70%	30.06.2026	1620.00	1162.02	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



POVA 6 Neo SG
25mm 1/1.81 1/327s ISO50



POVA 6 Neo SG
25mm 1/1.81 1/327s ISO50



POVA 6 Neo SG
25mm 1/1.81 1/327s ISO50



POVA 6 Neo SG
25mm 1/1.81 1/327s ISO50



POVA 6 Neo SG
25mm 1/1.81 1/327s ISO50

तमिलनाडु

25	रामेश्वरम (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	38%	31.12.2026	2120.00	438.83	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



Rameswaram, Tamil Nadu, India
143, Veerapathrasamy Kovil, Rameswaram, Tamil Nadu
623526, India
Lat 9.294762° Long 79.312146°
Friday, 08/05/2026 04:14 PM GMT +05:30



Rameswaram, Tamil Nadu, India
143, Veerapathrasamy Kovil, Rameswaram, Tamil Nadu
623526, India
Lat 9.294743° Long 79.312147°
Friday, 08/05/2026 04:14 PM GMT +05:30



Rameswaram, Tamil Nadu, India
143, Veerapathrasamy Kovil, Rameswaram, Tamil Nadu
623526, India
Lat 9.294536° Long 79.311988°
Friday, 08/05/2026 04:15 PM GMT +05:30



Rameswaram, Tamil Nadu, India
143, Veerapathrasamy Kovil, Rameswaram, Tamil Nadu
623526, India
Lat 9.294762° Long 79.312146°
Friday, 08/05/2026 04:15 PM GMT +05:30



Rameswaram, Tamil Nadu, India
143, Veerapathrasamy Kovil, Rameswaram, Tamil Nadu
623526, India
Lat 9.294762° Long 79.312146°
Friday, 08/05/2026 04:16 PM GMT +05:30

तेलंगाना

26	महबूबाबाद (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2259.51	16.01.2025	CPWD	-----	04%	-----	410.48	1849.03	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	-------	-----	-------	--------	---------	--



त्रिपुरा

27	गोकुलनगर (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	3604.15	12.03.2024	CPWD	25.12.2024	41%	04.12.2026	2320.00	1284.15	
----	------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



उत्तर प्रदेश

28	एसएसबी गदनीय पालिया कला (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	55%	30.11.2026	1420.00	1237.19	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



29	लखीमपुर खेरी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	75%	30.06.2026	1970.00	768.87	
----	--------------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



30	एसएसबी नानपारा बहराइच (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	44%	31.08.2026	720.00	1532.56	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	--------	---------	--




31	चित्रकूट (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2775.56	14.01.2025	CPWD	11.07.2025	33%	31.01.2027	1820.00	955.56	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



उत्तराखंड

32	न्यू टिहरी टाउन (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4292.81	29.11.2022	NPCC	27.01.2024	92%	31.07.2026	4000.00	292.81	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--

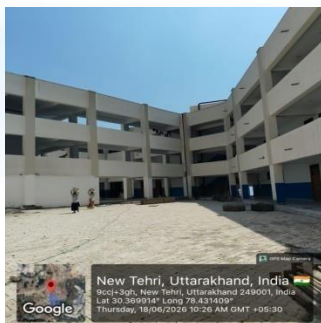

पश्चिम बंगाल

33	एन एफ आर जलपाईगुरी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	84%	31.08.2026	2720.00	1137.43	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



34	सी आर पी एफ सिलीगुड़ी (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	60%	31.10.2026	2020.00	1249.74	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



35	बी एस एफ कृष्णानगर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	90%	31.07.2026	3420.00	252.98	
----	---	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--




36	बोलपुर (‘A-1’ Type + 09SQ+BW)	2046.13	06.03.2023	CPWD	05.02.2025	66%	04.08.2026	1720.00	326.13	
----	----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	--------	--



37	सी आर पी एफ दुर्गापुर (‘B’ Type + 09SQ+BW)	3637.61	18.07.2023	CPWD	05.05.2025	41%	04.11.2026	2170.00	1467.61	
----	--	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--



38	तारकेश्वर (‘A’ Type + 09SQ+BW)	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	52%	15.08.2026	2120.00	1740.11	
----	-----------------------------------	---------	------------	------	------------	-----	------------	---------	---------	--

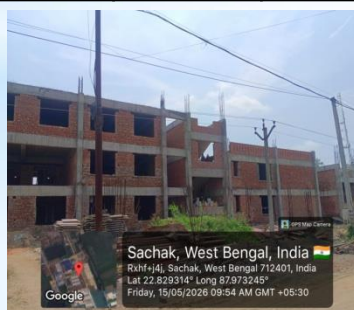

WORK YET TO BE STARTED

बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित अर्थात पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन

क्र.सं. ख्या / Sl. No.	के.वि. का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की (राशि लाख में)/ AA&ES (Rs. In lakh)	संस्वीकृति की तारीख/ Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख/ Stipulated Date of Completion	30.06.2026 तक निर्मुक्त राशि (लाख में) /Amount released till 30.06.2026 (Rs. In lakh)	शेष देयता (लाख में) / Balance Liabilit (Rs. In lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अ) विद्यालय भवन निर्माणाधीन										
अरुणाचल प्रदेश										
01	बांका/Banka (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4062.65	15.10.2025	CPWD	-----	0%	-----	420.00	3642.65	
दिल्ली										
02	नं. 4 दिल्ली कैंट (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2286.82	11.10.2024	MES	-----	0%	-----	1720.00	566.82	
हरियाणा										
03	जीसी सीआरपीएफ़ सोनीपत (‘A’ Type + 09SQ+BW)	2955.39	08.09.2022	CPWD	-----	0%	-----	1220.00	1735.39	
उत्तराखंड										
04	अगस्त्यमुनि (‘A’ Type + 09SQ+BW)	4446.19	19.10.2022	CPWD	-----	0%	-----	1720.00	2726.19	
